



YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



2019



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2019



“Gençliđi yetiřtiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz.”

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

1.	Genel Değerlendirme	1
1.1	Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2	Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi	2
1.3	2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	3
1.4	2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	3
2.	2019 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler	7
2.1	Eğitim Sektörü	9
2.1.1	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	9
2.1.2	Kampüs Altyapısı Projesi	10
2.1.3	Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesi	11
2.1.4	Muhtelif İşler Projesi	13
2.1.5	Yayın Alımı	17
2.2	Sağlık Sektörü	18
2.2.1	Muhtelif İşler Projesi	18
2.3	DHKS-Teknolojik Araştırma Sektörü	19
2.3.1	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	19
2.3.2	Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı	19
3.	Öneriler	20



Çeyrek asrı geride bırakan Üniversitemiz yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmayı, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ihtiyaçları karşılamayı gaye edinmiştir.

Günümüzde bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye var. Savunma sistemleri, tarımsal projeler, ulaşım alanında devrim niteliğinde yenilikler, yerli hızlı tren, dijital devrim, uydu fırlatma sistemi ve Akkuyu gibi önemli projelerin sadece konuşulmayıp uygulamaya geçildiği ülkemizde bilim yuvası Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. Dünyada yaşanan gelişmeleri takip eden, yorumlayan, geleceğin ihtiyaçlarını öngören ve bu ihtiyaçlara cevap verecek donanımda yerli ve milli duruşundan taviz vermeyen, sadece maddi kaygılarla hareket etmeyen nesiller yetiştirmek Aziz Milletimiz karşısında boynumuzun borcudur.

Prof. Dr. Ersan ASLAN
Rektör

1. Genel Deęerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

2019 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemiz için Eğitim Sektöründe 19.500.000,00 TL, Sağlık Sektöründe 3.450.000,00 TL ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe 3.446.000,00 TL kaynak ayrılması öngörölmüştür. Bu kaynağın 25.170.000,00 TL'sinin hazine yardımlarından, 280.000,00 TL'sinin Öz gelirlerden ve 946.000,00 TL'sinin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesi çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik paydan karşılanması öngörölmüştür.

Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için bazı projelerde ekleme ve aktarmalar yapılarak ilgili yatırım projeleri revize edilmiştir. Bu çerçevede özellikle Eğitim Sektöründe Muhtelif İşler Projesi ve Kampüs Altyapı Projesine ödenek eklemeleri gerçekleşmiştir.

Yılsonu itibariyle bakıldığında 2019 yılı kaynağı toplam **26.646.000,00** TL'ye ulaşmış olup bu kaynağın **25.170.000,00** TL'si Hazine yardımlarından, **280.000,00** TL'si öz gelirlerden, **250.000,00** TL'si Üniversitemiz likit kaynaklarından ve **946.000,00** TL'si de Döner Sermaye gelirlerinden sağlanmıştır.

Açıklama	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Kaynak
Hazine Yardımı	25.170.000,00	25.170.000,00
Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karşılığı ödenek)	280.000,00	530.000,00
Döner Sermaye*	946.000,00	946.000,00
Toplam	26.396.000,00	26.646.000,00
* Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay gruba dahildir.		

1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

		Yıllar		
		2017	2018	2019
Enstitüler	Fen Bilimleri Enstitüsü	260	260	260
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	370	370	520
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	260	260	260
Toplam (m ²)		890	890	1.040
Fakülteler	Diş Hekimliği Fakültesi	28.100	28.100	28.100
	Eğitim Fakültesi	10.890	10.890	10.890
	Fen Edebiyat Fakültesi	32.577	32.577	32.577
	Güzel Sanatlar Fakültesi	8.230	8.230	8.230
	Hukuk Fakültesi	11.000	11.000	11.000
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	23.600	23.600	23.600
	Mühendislik Fakültesi	44.500	44.500	44.500
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	48.635	48.635	48.635
	Spor Bilimleri Fakültesi	5.844	5.844	5.844
	Veteriner Fakültesi	30.600	30.600	30.600
	Tıp Fakültesi	46.000	46.000	46.000
	İslami İlimler Fakültesi	1.216	1.216	1.216
Toplam (m ²)		291.192	291.192	291.192
Yüksek Okullar	Yabancı Diller Yüksekokulu	960	960	960
	Toplam (m ²)	960	960	960
Meslek Yüksekokulları	Adalet Meslek Yüksekokulu	500	500	500
	Delice Meslek Yüksekokulu	-	-	3846
	Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu	1.172	1.172	1.172
	Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	4.258	4.258	4.258
	Keskin Meslek Yüksekokulu	4.309	4.309	4.309
	Kırıkkale Meslek Yüksekokulu	10.544	10.544	10.544
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.063	3.063	3.063
Toplam (m ²)		24.806	24.806	28.598

1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemiz misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda 2019 Yılı Yatırım Programına alınan 8 adet projeye, yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 2019 Yılı Yatırım Programında eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 1 adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplamda 8 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekân ile binaların yapımı hedeflenmiştir. 2019 mali yılında yatırım bütçe imkânları doğrultusunda kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

- Etüd proje kapsamında, 3 adet yatırım projesi yapılmıştır. 2019 Yılı Yatırım Programı ile verilen ödeneğin büyük kısmı başka projelere aktarılmıştır. Yapılan projeler; jeolojik zemin etüdü, mekanik ve elektrik tesisat çizimi ve kantin projesi olarak gerçekleşmiştir.
- Kampus altyapısı projesi kapsamında, 2019 yılı içerisinde 4 hakediş yapılmıştır. 2019 yılı başında %96 olan fiziki gerçekleşme, yıl sonu itibari ile %99 seviyesinde olmuştur.
- Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı kapsamında, 2019 yılı yatırım programında öngörülen ve yapılan revizyonlarla birlikte toplam ödeneğin % 94'lük kısmı kullanılmıştır.
- 2019 Yılı Yatırım Programı ile 3.302.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilen Eğitim Sektörü, Muhtelif İşler Projesine; büyük onarım işlerinde kullanılmak üzere 2.050.000,00 TL ödenek diğer projelerden revize edilerek aktarılmıştır. Bu aktarımlar sonucunda 3.795.000,00 TL'ye ulaşan toplam ödeneğin 3.761.082,00 TL'si harcanmıştır.



1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2019 yılı yatırım uygulamalarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Öncelikle tablolar halinde genel görünüm sunulmaya çalışılmış daha sonra da detaylarıyla projeler incelenmiştir:

SEKTÖRLER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

SEKTÖR KODU	PROJENO	AÇIKLAMA	2019 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4-5	BLOKE (7)	HARCAMA (8)	GERÇEKLEŞME %
				KURUM İÇİ (2)	YEDEK (3)	LİKİT (4)					
		YATIRIMLAR TOPLAMI	26.396.000	3.067.732	0	250.000	3.067.732	26.646.000	0	25.704.386	96,47
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	3.450.000	577.262	0	0	577.262	3.450.000	0	3.444.966	99,85
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	19.500.000	2.490.470	0	250.000	2.490.470	19.750.000	0	18.813.420	95,26
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.446.000	0	0	0	0	3.446.000	0	3.446.000	100,00

¹ Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneye(Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.
² 280.000 TL si Öz Gelirlerden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.
³ Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

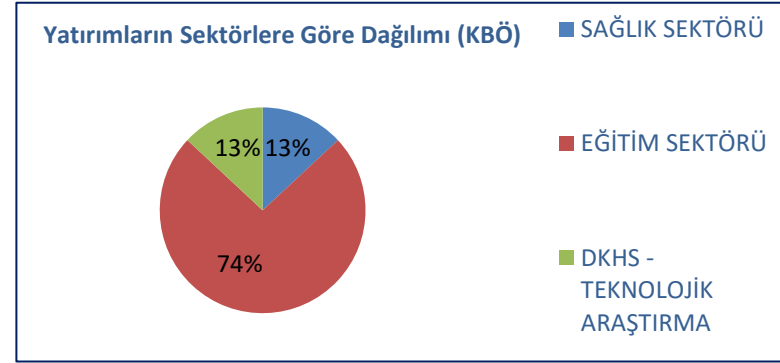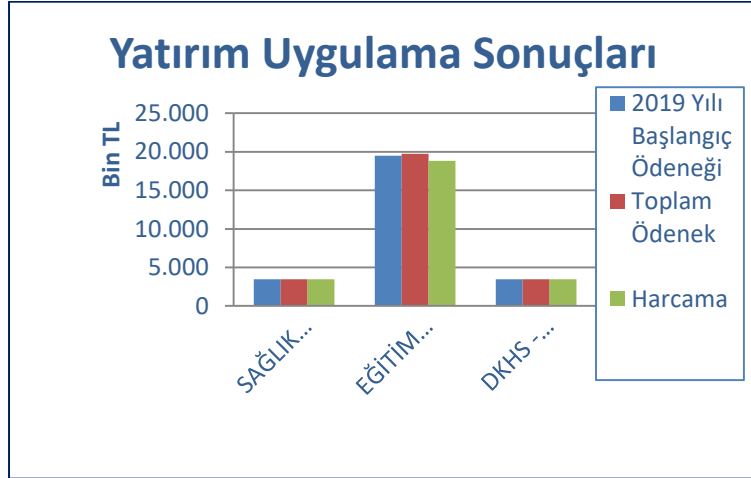

PROJELER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

SEKTÖR KODU	PROJENO	AÇIKLAMA	2019 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4-5	BLOKE (7)	HARCAMA (8)	GERÇEKLEŞME %
				KURUM İÇİ (2)	YEDEK (3)	LİKİT (4)					
		YATIRIMLAR TOPLAMI	26.396.000	3.067.732	0	250.000	3.067.732	26.646.000	0	25.704.386	96,47
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	3.450.000	577.262	0	0	577.262	3.450.000	0	3.444.966	99,85
	2019I000260	MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	3.450.000	577.262	0	0	577.262	3.450.000	0	3.444.966	99,85
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	19.500.000	2.490.470	0	250.000	2.490.470	19.750.000	0	18.813.420	95,26
	2019H036750	MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM)	3.302.000	2.490.470	0	150.000	320.470	5.622.000	0	5.378.928	95,68
	2019H036740	YAYIM ALIMLARI	1.100.000	0	0	0	120.000	980.000	0	945.798	96,51
	2019H036730	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	298.000	0	0	0	250.000	48.000	0	47.082,00	98,09
	1993H031840	KAMPUS ALT YAPISI	2.000.000	0	0	100.000	350.000	1.750.000	0	1.722.058,00	98,40
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	12.800.000	0	0	0	1.450.000	11.350.000	0	10.719.554,32	94,45
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.446.000	0	0	0	0	3.446.000	0	3.446.000	100,00
	2019K120340	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	946.000	0	0	0	0	946.000	0	946.000	100,00
	2017K121220	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARINA İLAVE ALTYAPI	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00
<p>¹ Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneye (Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.</p> <p>² 280.000 TL si Öz Gelirlerden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.</p> <p>³ Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.</p>											

SEKTÖR-PROJE-BİRİM İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

SEKTÖR KODU	PROJENO	AÇIKLAMA	2019 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	EKLENEN			DÜŞÜLEN ÖDENEK (5)	TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4+5	BLOKE (7)	HARCAMA (8)	GERÇEKLEŞME %
				KURUM İÇİ (2)	YEDEK (3)	LİKİT (4)					
		YATIRIMLAR TOPLAMI	26.396.000	3.067.732	0	250.000	3.067.732	26.646.000	0	25.704.386	96,47
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	3.450.000	577.262	0	0	577.262	3.450.000	0	3.444.966	99,85
	2019H00260	MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	3.450.000	577.262	0	0	577.262	3.450.000	0	3.444.966	99,85
		DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	690.000	131.975	0	0	131.975	690.000	0	685.275	99,32
		06.1 Mamul Mal Alımları	590.000	0	0	0	131.975,00	458.025	0	456.045,62	99,57
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	100.000	131.975,00	0	0	0	231.975	0	229.229,40	98,82
		TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	2.760.000	445.287	0	0	445.287	2.760.000	0	2.759.691	99,99
		06.1 Mamul Mal Alımları	760.000	0	0	0	445.287,38	314.713	0	314.712,62	100,00
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	445.287,38	0	0	0	2.445.287	0	2.444.978,79	99,99
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	19.500.000	2.490.470	0	250.000	2.490.470	19.750.000	0	18.813.420	95,26
	2019H036750	MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM)	3.302.000	2.490.470	0	150.000	320.470	5.622.000	0	5.378.928	95,68
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	722.000	20.000	0	120.000	191.520	670.480	0	566.052	84,42
		06.1 Mamul Mal Alımları	362.000	0	0	120.000	87.520	394.480	0	327.963,99	83,14
		06.1 Mamul Mal Alımları (Öz Gelir)	280.000	0	0	0	104.000	176.000	0	144.530,49	82,12
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	80.000	20.000	0	0	0	100.000	0	93.557,46	93,56
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	835.000	184.000	0	30.000	128.950	920.050	0	817.096	88,81
		06.1 Mamul Mal Alımları	565.000	30.000	0	0	50.000	545.000	0	539.733,07	99,03
		06.1 Mamul Mal Alımları	0	104.000	0	0	0	104.000	0	85.610,58	82,32
		06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	250.000	0	0	30.000	78.950	201.050	0	170.843	84,98
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	20.000	50.000	0	0	0	70.000	0	20.910	29,87
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.745.000	2.050.000	0	0	0	3.795.000	0	3.761.082	99,11
		06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	700.000,00	800.000	0	0	0	1.500.000	0	1.477.221,82	98,48
		06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.045.000,00	1.250.000	0	0	0	2.295.000	0	2.283.860,15	99,51
		TIP FAKÜLTESİ	0	218.770	0	0	0	218.770	0	216.998	99,19
		06.1 Mamul Mal Alımları	0	187.520	0	0	0	187.520	0	187.497,56	99,99
		06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	0	31.250	0	0	0	31.250	0	29.500,00	94,40
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	17.700	0	0	0	17.700	0	17.700	100,00
		06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	0	17.700	0	0	0	17.700	0	17.700	100,00
	2019H036740	YAYIM ALIMLARI	1.100.000	0	0	0	120.000	980.000	0	945.798	96,51
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.100.000	0	0	0	120.000	980.000	0	945.798	96,51
		06.1 Mamul Mal Alımları	1.100.000	0	0	0	120.000	980.000	0	945.798,16	96,51
	2019H036730	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN EİT PROJESİ	298.000	0	0	0	250.000	48.000	0	47.082,00	98,09
	1993H031840	KAMPUS ALT YAPISI	2.000.000	0	0	100.000	350.000	1.750.000	0	1.722.058,00	98,40
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	12.800.000	0	0	0	1.450.000	11.350.000	0	10.719.554,32	94,45
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.446.000	0	0	0	0	3.446.000	0	3.446.000	100,00
	2019K120340	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	946.000	0	0	0	0	946.000	0	946.000	100,00
	2017K121220	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARINA İLAVE ALTYAPI	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00

¹ Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneye (Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.

² 280.000 TL si Öz Gelirlerden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.

³ Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

2. 2019 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler

- *Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (4.400 m²)*

Etüt ve projesi tamamlanan 4.400 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarları binası içerisinde fen ve sağlık alanında hizmet verecek 32 adet laboratuvar (+5 adet rezerv), 4 numune odası, 20 ofis, 2 lisansüstü ofis, 1 toplantı odası, 1 seminer odası ve 1 kafeterya bulunacaktır.



Merkezi Araştırma Laboratuvarı

- **İslami İlimler Fakültesi Bina Projesi**

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen İslami İlimler Fakültesi inşaat ihalesi, yıllara sari olacak şekilde (2018-2020), 18.04.2018 tarihinde yapılmış ve ihalesi uhdesinde kalan firmayla, 13.06.2018 tarihinde 37.745.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmış ve inşaat imalatına başlanmıştır.

İslami İlimler Fakültesi bina projesi toplam 22.500 m2 kapalı ve 8.450 m2 açık alan inşaatı olacak şekilde projelendirilmiştir. Projede en büyüğü 462 kişi kapasiteli olmak üzere 6 adet salon, 32 ila 72 kişilik 34 adet derslik, 9 adet öğrenci etkinlik salonu ve 62 adet öğretim üyesi odası bulunacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İnşaatı İş'i'nin sözleşme bedeli 37.745.000,00 TL'dir. Ödenek Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan Reklam Sözleşmesinden karşılanacaktır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince, Üniversitemize İslami İlimler Fakültesi binası yaptırılması amacıyla 33.487.500,00 TL ödenmesi uygun görülmüş ve bu durum her iki kurum tarafından bir protokol ile imza altına alınmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen İslami İlimler Fakültesi inşaat ihalesi, yıllara sari olacak şekilde (2018-2020), 18.04.2018 tarihinde yapılmış ve ihalesi uhdesinde kalan firmayla, 13.06.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 22.500 m² inşaat imalatına başlanmıştır.



İslami İlimler Fakültesi

Projede bazı imalatlarda deęişikliğe gidilerek, iş azalışı imatları planlanmıştır. Planlama sonrası İslami İlimler Fakültesi inşaat projesinin toplam maliyeti 46.398.820,00 TL'ye revize edilmiştir. İnşaat maliyetinin 33.487.500,00 TL'si Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca karşılanacak, kalan 12.911.320,00 TL'nin, 2020 yılı için 4.000.000,00 TL'si Üniversitemiz likit fazlasından karşılanacaktır.

Proje tamamlandığında Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi ile birlikte diğer akademik birimlerin derslik ihtiyacı karşılanabilecek, bölgesel ve ulusal düzeyde kongre, sempozyum gibi akademik ve sosyal katkı sağlayacaktır.

2020 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge'nin III. Yatırım Programına Yıl İçinde Yeni Proje Alınması ve Çıkarılması İşlemleri başlığı altında belirtilen hükümlere uygun olarak 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesine alt proje olarak İslami İlimler Fakültesi Yapım İşleri 2020 Yılı Yatırım Programına alınmıştır.

2.1 Eğitim Sektörü

2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (2019H036730)

- Etüt proje kapsamında 3 adet büyük yatırım projesi yapılmıştır:
 - Veteriner Fakültesi Keskin çiftlik alanına jeolojik zemin etüt yapılması,
 - Keskin hindi çiftliği mekanik ve elektrik tesisat proje çizimi,
 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kantin yapımı projelerinin hazırlanmasıdır. (mimari, mekanik, statik, elektrik uygulama projeleri)

2019 Yılı Yatırım Programı ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 298.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde 250.000,00 TL ödenek düşülerek revizyon yapılmış ve toplam ödenek 48.000,00 TL kalmıştır. Yılsonu itibariyle proje ödeneğinin 47.082,00 TL'si harcanarak toplam ödeneğin %98'i harcanmıştır.

2.1.2 Kampüs Altyapısı (1993H031840)

Proje kapsamında yıl içerisinde 4 hakediş yapılmıştır. 2019 yılı başında % 96 olan fiziki gerçekleşme, yıl sonu itibari ile % 99 seviyesinde olmuştur. 2020 Şubat itibari ile işin tamamı bitirilerek atık su arıtma tesisi işletmesi Üniversitemize bırakılmıştır.

Ayrıca 2019 yılı içerisinde aşağıdaki işler yapılmıştır:

- Hukuk Fakültesi önü gölet aydınlatılması,
- 2 adet otobüs durağı alımı,
- Kampüs alanı içerisinde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na küçük bakım-onarım işi yapılması,
- KKÜ Bağlı Birimler kullanma suyu deposu ve müştemilatı mal alımı,
- KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi atık depoları alım işi,
- İslami İlimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi altındaki göletin temizlenmesi, ozanlanması ve ilaçlanmasının yapılması,
- KKÜ kampüs yeşil alanlarda kullanılmak üzere ahşap piknik masası alınması (25 adet),
- Muhtelif bitki ve böcek ilacı alımı işi (dengeli çim ve bitki bakımı için yavaş salımlı gübre 6 ton),
- 300 m3 yanmış hayvan gübresi, 50 paket fare ilacı, 4.000 adet gül, 15.000 adet mevsimlik çiçek alımı,
- KKÜ kampüs alt yapısı inşaatı işi (3 hakediş)
- KKÜ yerleşkesinin su ihtiyacını karşılama amaçlı daha önceden yapılmış sondaj kuyusunun temizlenerek çalışır duruma getirilmesidir.



2019 Yılı Yatırım Programı ile projeye 2.000.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde projeye 100.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneğin 350.000,00 TL'lik kısmı büyük onarım giderlerini karşılamak üzere Muhtelif İşler (Eğitim) projesine revize edilmiştir ve toplam ödenek 1.750.000,00 TL kalmıştır. Yılsonu itibariyle proje ödeneğinin 1.722.058,00 TL'si harcanarak toplam ödeneğin %98'i harcanmıştır.

2.1.3 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (2009H031640)

2019 Yılı Yatırım Programı ile projeye 12.800.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde toplam ödeneğin 1.450.000,00 TL'lik kısmı büyük onarım giderlerini karşılamak üzere Muhtelif İşler (Eğitim) projesine revize edilmiştir. 2019 yılı itibariyle toplam ödenek 11.350.000,00 TL olup ödeneğin yaklaşık % 94'lük kısmı olan 10.719.554,32 TL'si harcanmıştır.

- ***Merkezi Derslikler İnşaatı (11.500 m2)***

17/07/2017 yılında başlanan projenin 2019 yılı başında %56 fiziki gerçekleşmesi, yıl sonu itibari ile %73 seviyesinde olmuştur. Derslikler ve Merkezi Birimler binasında 3 adet 494 kişilik amfi, 6 adet 284 kişilik amfi, 1 adet kafeterya, 10 adet öğretim görevlisi odası, 7 adet oda, 184 kişilik kantin mevcuttur.



Merkezi Derslikler

Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesinin alt projesi olan Merkezi Derslikler İnşaatı Projesinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL'dir. Yapılan ekleme ve çıkarmalarla 5.567.988,00 TL harcanmıştır.

- ***Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı (8.800 m2)***

2017 yılında başlanan projenin 2019 yılı başında % 32 fiziki gerçekleşmesi, yılsonu itibari ile % 38 seviyesinde olmuştur. Kongre merkezi binası içerisinde 10 adet idari ofis (81 m2), 1 adet VİP salonu (83 m2), 1 adet 950 kişilik salon (1159 m2), 1 adet 108 kişilik salon (110 m2), 1 adet 167 kişilik salon (147 m2), 1 adet toplantı salonu (62 m2) , otopark (966 m2), fuaye (438 m2) , kulüp odası (247 m2), sosyal alan (166 m2) mevcuttur.

Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesinin alt projesi olan Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı Projesinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde yapılan ana projenin alt projeleri arasında ve projeler arasında (Muhtelif İşler Projesi-Eğitim Sektörü) yapılan revizyon işlemleri sonucunda toplam ödeneğin 2.031.382,00 TL'si harcanmıştır.



Kongre ve Kültür Merkezi

- *Delice Meslek Yüksekokulu İnşaatı (3.850 m2)*

2017 yılında başlanan ve etüd çalışmaları yapılan projenin 2019 yılı başında %62 olan fiziki gerçekleşmesi 2019 yılında tamamlanmıştır. Bina içerisinde 1 adet 100 kişilik konferans salonu (145 m2), 1 adet laboratuvar (76 m2), 1 adet bilgisayar odası (53 m2), yaklaşık 40 kişilik 10 adet sınıf (53 m2), 1 adet kantin, 26 adet idari ofis (90 m2), 1 adet kütüphane (164 m2), 1 adet yemekhane (125 m2), 1 adet toplantı odası (46 m2) mevcuttur.

2019 yılı Yatırım Programı ile Delice Meslek Yüksekokulu İnşaatı alt projesine 2.800.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içindeki revize işlemleri sonrasında 3.120.185,00 TL ödenek harcanmıştır.



Delice Meslek Yüksekokulu İnşaatı

2.1.4 Muhtelif İşler Projesi (2019H036750)

2019 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine **3.302.000,00 TL** başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde **150.000,00 TL** likit karşılığı ödenek, **2.490.470,00 TL** diğer proje ödeneklerinden kurum içi aktarma yapılarak ekleme ve **320.470,00 TL** ödenek ise diğer projelere aktarılarak revize edilmiş olup yıl sonu itibariyle **5.622.000,00 TL** olan ödeneğin;

- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat alımı, makine teçhizat bakım onarımları için 2019 yılı başlangıç ödeneği 722.000,00 TL olan **İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına** 120.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme, 20.000,00 TL kurum içi ödenek aktarma ile toplam ödenek 862.000,00 TL'ye ulaşmıştır. 191.520,00 TL ödenek ise diğer projelere revize edilmiştir. Yıl sonunda 670.480,00 TL gerçekleşen ödeneğin %84'lük kısmı olan 566.052,00 TL'si harcanmıştır.
- Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları için 2019 yılı başlangıç ödeneği 835.000,00 TL olan **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına** 2018 yılından kalan 30.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme, 184.000,00 TL kurum içi ödenek aktarma ile toplam 1.049.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 128.950,00 TL ödenek projeler arasında revize edilmiş olup 920.050,00 TL toplam ödeneğin %89'u olan 817.096,00 TL'si harcanmıştır.
- Başlangıç ödeneği bulunmayan **Tıp Fakültesi Dekanlığına** ihtiyaçları doğrultusunda 218.770,00 TL ödenek aktarılmış ve %99'lük kısmı olan 216.998,00 TL harcanmıştır.
- **Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının** Muhtelif İşler Projesinde 2019 yılı başlangıç ödeneği bulunmayıp 17.700,00 TL ödenek diğer projelerden revize edilmiş ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.
- Üniversitemiz birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat alımı, makine teçhizat bakım onarımları ve gayrimenkullerinin büyük onarımlarının karşılanabilmesi amacıyla **Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına** toplam 1.745.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle proje kapsamında aşağıda detaylandırılan söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesi için **3.761.082,00** TL harcanmıştır.

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

2019 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri bütçe tertibi başlangıç ödeneği 700.000,00 TL olup yıl içinde diğer projelerden toplam 800.000,00 TL revizyon işlemi yapılmıştır. Yılsonunda toplam ödenek 1.500.000,00 TL'ye ulaşmış olup %98'lik kısmı olan 1.477.221,82 TL ödenek harcanmıştır.

2019 Yılı Yatırım Programı gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ve 4734 sayılı Kanun gereğince imalatların yapılabilmesi için ihaleleri yapılarak bitirilmiştir. Büyük Onarım işlerinde bahsedilen Fakülte, Yüksekokul ve Hizmet binalarımızın bakım onarım işleri için mahal listesi, mimari proje, kroki, röleve, kesit gibi imalatlar tamamlanmıştır.

Üniversitemiz binaları ve tesislerinde kullanılan makine teçhizatın, bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar, hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri, menkul malların bakım-onarımını yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda örnekleri verilen işler 2019 yılı içerisinde yapılmıştır:

- Isıtma, sihi tesisat, küçük bakım-onarım yapılması
- Mekanik tesisat, küçük bakım-onarım yapılması
- UPS (kesintisiz güç kaynağı) cihazı aküsü alımı
- Isıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin rutin bakımlarının yapılması
- Kampüs bina otomasyon sistemleri bakım-onarımını
- Klima santralleri ve soğutma gruplarının rutin bakımlarının yapılması
- Jeneratör periyodik bakım-onarımını yapılması
- Kampüs alanı içerisinde bulunan yolların yol çizgileri için boya malzemesi alımı
- Klima, tamir, bakım, montaj, demontaj işlerinin yapılması
- Çim biçme makinalarında kullanılmak üzere yedek parça malzeme alımı
- Kampüs kartlı geçiş sistemi yapılması
- Eşanjörlere bakım-onarım
- Kalorifer kazanı ve brülör mal alımı
- Hızar makinasına benzin deposu, piston ve bıçak zinciri alımıdır.

06.7. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

2019 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri bütçe tertibi başlangıç ödeneği 1.0450.000,00 TL olup yıl içinde diğer projelerden toplam 1.250.000,00 TL revizyon işlemi yapılmıştır. Yılsonunda toplam ödenek 2.295.000,00 TL'ye ulaşmış olup 2.283.860,15 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz binaları ve tesislerinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde gayrimenkullerin sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının kurum tarafından değil ihale suretiyle üçüncü şahıslara yaptırılması durumunda, (örneğin hizmet binasının çatısının yenilemesinin veya binada yapılacak büyük bakım-onarımının, ihale suretiyle müteahhide yaptırılması) müteahhide yaptırılacak işleri kapsamaktadır. Bu kapsamda aşağıda örnekleri verilen işler 2019 yılı içerisinde yapılmıştır:

- Kırıkkale Üniversitesi çeşitli birimlerin büyük onarımı, (ihale-2 hakediş)
- Çeşitli birimler 2.kısım büyük onarımı, (ihale-2 hakediş)
- Çatı akıntıları olduğundan dere yataklarının değişmesi işi,
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde küçük bakım-onarım işleri yapılması,
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde alüminyum pvc doğrama, cam ve bakım-onarım yapılması,
- Asma tavan yapılması ve askı çubuğu montajı yapılması, taş yünü asma tavan plakası takılması,
- Muhtelif yerlere elektrik işleri yapılması,
- At gezintisi alanı ve çevre çiti yapılması,
- Hukuk fakültesine oda yapımı,
- Izgara (kanal bağlantısı için yağmur suları için) ve laboratuvarlara granit tezgah yapımı, evye ve musluk değişimi yapılması,
- Demir doğrama, çatı ve kaynak işlerinin yapılması,
- Kampüs alanı içerisinde yollarda kasis yapılması,
- Yangın kapılarının bakım-onarım tadilatı,
- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi acil yolu ile otopark arası bağlantı yolu için gerekli hazırlıkların yapılması,
- Otopark girişinde betonarme istinat duvarı yapılması,
- Led projektör montaj ve demontaj işi,

- Tesisat bacası yapılması ve Tıp Fakültesi tesisat işi,
- Kilitli parke taşı ve beton bordür döşenmesidir.

2.1.5 Yayın Alımı (2019H036740)

Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; kullanıcı profilini de dikkate alarak kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlamak, bunların teknik işlemlerini yapmak, hızlı ve kolay erişimini temin etmek ve hizmetlerin kullanıcı merkezli planlanmasını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yayın alımları için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bütçesine başlangıç ödeneği 1.100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 120.000,00 TL ödenek Muhtelif İşler Projesine revize edilmiştir. Toplam ödenek 980.000,00 TL'nin %97'lik kısmı olan 945.798,00 TL yıl içinde harcanmıştır.

Basılı kitap, dergi aboneliğinde, yerli ve yabancı elektronik veri tabanları aboneliği sağlanarak öğrenci ve akademik personellerin hizmetlerine sunulmuştur.



2.2 Saęlık Sekt6r6

2.2.1 Muhtelif İşler Projesi (2019I000260)

2019 Yılı Yatırım Programında saęlık sektöründe yer alan proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fak6ltesi Dekanlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin ve Diş Hekimliği Fak6ltesi Dekanlığının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, makine teçhizat alımları ile mevcut tıbbi cihaz ve makine teçhizatlarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere 3.450.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında yılsonu itibari ile 3.444.966,00 TL'si harcanarak saęlık hizmetlerine sunulmuştur.



2.3 DKHS-Teknolojik Araştırma Sektörü

2.3.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2019K120340)

Bu proje kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 946.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.



2.3.2 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı (2017K121220)

Bu proje kapsamında 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır.

2019 Yılı Yatırım Programında yapım işi projesi için 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde BAP özel hesabına aktarılmıştır. Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle yüklenici firma tasfiye talep etmiş, ancak uygun görülmemiştir. 2019 yılında hakediş yapılmamıştır. 2020 yılı için toplamda 7.500.000,00 TL kullanılabilir ödeneği olacaktır. Gerçekleşme oranı %24’tür. 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

3. Öneriler

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan ödeneklerde, 2019 yılına oranla artış bulunmamaktadır. Merkezi Derslikler, İslami İlimler Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatlarının bir an önce bitirilmesi için Derslikler ve Merkezi Birimler projesinin kaynağının artırılması gerekmektedir.

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Enstitülerimizin hizmet binası ihtiyaçları bulunmaktadır. Önceliklendirme yapılarak, yeni inşaatlara başlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

