



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

**2008 YILI YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart-2009

1. Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının; belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüştür.

Kamu harcamalarında, kaynakların; yerinde, zamanında gerektiği ölçüde yapılması esastır. Yapılan her yapının alınan her makine ve cihazın bir kullanım ömrü vardır. Yapılan yatırımların (İnşaatların) tamamlama sürelerinin uzaması, kaliteyi düşürdüğünden kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

1992 yılında kurulan ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2008 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %86 eğitim, %13 sağlık %1 teknolojik araştırmalarla ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Gelişen dünyada; bilimsel ve teknolojik gelişimini tamamlayarak ilerlemeyi hedefleyen Üniversitemizde 2008 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılarak 2008 yılında büyüme ve gelişmede önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet MURAT ÇAKMAK
Rektör

2. Genel Değerlendirme

- Kuruluşun Vizyonu :
 - Bilimsel rekabet ortamında temel akademik standartları sağlayarak eğitimin kalitesini yükselten, bilim ve teknoloji üretme işlevi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen,
 - Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip,
 - İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite - sanayi - toplum işbirliğini sağlamada öncü,
 - Her alanda Türk kültür ve sanatının özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan,
 - Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli büyüyen ve gelişen; bir “**dünya üniversitesi**” olmaktadır.
- Kuruluşun Misyonu:

Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve öğretim anlayışı ile;

- Toplumun ihtiyaçlarına ve kalkınma planı hedeflerine uygun, bireyin ve toplumun gönenç seviyesini yükseltmek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bedensel, duygusal, düşünsel ve etik bakımdan dengeli, örgün, yaygın ve sürekli eğitim yoluyla; eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak,
- Bireylerin uluslararası standartlarda yeteneklerini geliştirerek ve gerekli bilgisel donanımı kazanarak kendini mutlu edecek, ülkenin kalkınıp gelişmesinde rol alabilecek bir meslek edinmelerini sağlamak,
- Ulusal ve evrensel değerlere bağlı 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan gücünü yetiştirmek gayesiyle öğrencilerimizin bireysel gelişiminin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kalkınması, büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

- Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :
 1. Cumhuriyetin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim-öğretim sürecinin geliştirilerek devam ettirilmesi.
 2. Kırıkkale Üniversitesinin sürekli iyileştirme ve toplam kalite yönetimini uygulayan bir “Eğitim Mükemmeliyet Merkezi” haline dönüştürülmesi ve birimlerin kalite ve gelişimlerinin teşvik edilmesi.
 3. Lisans ve lisansüstü yeni öğretim programlarının açılması .
 4. Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi.
 5. Kırıkkale Üniversitesinin fizikî gelişiminin standartlara uygun olarak tamamlanması.
 6. AR-GE çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde teşvik edilmesi.
 7. Belirli akademik alanlarda ulusal ve uluslararası tanınır ve bilinir hale gelinmesi.
 8. Kırıkkale Üniversitesinin tanıtımı için her türlü olanağın kullanılması.
 9. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılması ve bilgiye ulaşım imkânlarının artırılması.
 10. Uluslararası saygınlığı olan bilim adamlarının deneyimlerinden yararlanılması.
 11. Akademik atama ve akademik yetkinlik programlarının uygulanması.
 12. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak öğrencilerin kişisel gelişiminde etkin rol alınması.
 13. Mezunlar Yönetim Sisteminin oluşturulması.
 14. Kâğıtsız yönetim ve yönetim bilişim sistemi oluşturulması.
 15. Kırıkkale Üniversitesinin bölgesel bilimsel toplantı ve fuar merkezi haline getirilmesi.
 16. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirerek, endüstri-sahipli ve yönlendirme laboratuvarların kurulması, ortak kullanımlarının sağlanması.
 17. Kırıkkale Üniversitesinin Kırıkkale Belediyesi ile ortak anlaşması olan “Kent Konseyi” kapsamında teknik eğitim kurslarının açılması.
 18. Kırıkkale Üniversitesinin diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğinin desteklenmesi.
 19. Kırıkkale Üniversitesinin akademik sağlık birimleri ile Kırıkkale ili ve çevresi arasında iletişim-koordinasyon sağlayan katılımcı işbirliğinin oluşturulması.
 20. Üniversitemizin sahip olduğu doğa güzelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi.
 21. Sporu ve sportif etkinlikleri üniversitenin bütününe yayarak, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katkıda bulunulması.

- Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları :

Üniversitemizin 2008 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı kamulaştırma ödeneği 10.000 YTL hariç 14.860.000 YTL olup, yıl içerisinde 3.000.000 YTL hazine kaynaklı olmak üzere eklenen 3.561.000 YTL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 18.421.000 YTL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin 351.000 YTL'si özgelirlerden, 18.070.000 YTL'si hazine yardımları olmak üzere Özel Bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

- Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :

ALANLAR	MİKTAR
ARAZİLER:	23.103.000 m ²
Yahşihan, Keskin, Hacılar, Sağlık, Delice Yerleşkeleri Toplamı	
Delice Yerleşkesi (5.272 m ² Arsa 78.500 m ² Tarla)	
EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARI:	148.582 m ²
Derslikler, Laboratuvar, Amfiler	
Delice MYO 2008 Yılında eklenen (1.500 m ²)	
Ünv.Arşt.ve Uyg.Hst Ek Binaları (1.050 m ²)	
HİZMET BİNALARI:	35.499 m ²
Kütüphane, Isıtma Merkezi,	
Mediko Sosyal ve sosyal Tesisler, Kafeterya-Yemekhane, Atölyeler,	
Su Deposu, Kreş (320 m ²), Kırıkkale MYO Kafeterya (100 m ²),	
Delice Yurtları (1.550. m ²), diğer hizmet binaları	
GENEL HİZMET ALANLARI:	1.679.000 m ²
Gölet, Atatürk Anıt Alanı, Oto Park, Ormanlık Alan,	
Ağaçlandırma Alanı, Su Kuyuları ve Bahçeler	
İDARİ BİNALAR:	898 m ²
KAPALI SPOR SALONU:	1.540 m ²
SPOR AMAÇLI BİNALAR:	363 m ²
SPOR SAHALARI(Açık):	10.444 m ²
OLİMPİK STATYUM:	18.000 m ²
SU KUYULARI:	3 Adet
HAYVAN BARINAĞI:	36 m ²
KÖPRÜ VE GEÇİTLER(1 Adet):	15.000 m ²

- 2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :

Üniversitemiz 2008 yılı Yatırım Programında Eğitim sektöründe 12 adet Sağlık sektöründe 3 adet ve Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 16 adet projeye Üniversitemizin fiziki mekan, makine teçhizat ile çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizat bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması, çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması ve bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.

Belirlenen bu hedefler çerçevesinde ilgili projeler kapsamında ödeneklerin tamamına yakın bir kısmı kullanılarak;

- 12.000 m² lik Mediko-Sosyal ve Sosyal Tesisler Hizmet Binası İnşaatı 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, geçici kabulü yapılarak teslim alınmış ve Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur.
- Mühendislik Fakültesi İnşaatı 24.000 m²'lik kısmı 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, geçici kabulü yapılarak teslim alınmış ve hizmete sunulmuştur.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatında 2008 yılı sonu itibari ile %98 fiziki ve mali ilerleme sağlanmıştır. 20.000 m²'lik kısmı 2009 yılında geçici kabulü yapılarak hizmete alınacaktır.
- Üniversitemiz 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Etüd Proje işlemleri yapılarak 2009 yılında ihalesi yapılabilir hale getirilmiştir.
- Üniversitemiz Veteriner Fakültesinin Etüd Proje işlemleri yapılarak 2009 yılında ihalesi yapılabilir hale getirilmiştir
- Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bakım onarımları ve cephe kaplamaları yapılmış, ek olarak yapılan prefabrik bina ile 1.050 m²'lik bir alan kazanılmıştır.
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinin bina bakım onarımları yapılarak hizmete alınmıştır.
- Yerleşkemizin ana ulaşım yolu kenarlarında seçilen uygun yerlerde durak yerleri inşa edilmiştir.
- Yerleşkemize köprülü üst geçit kavşaktan giriş yolunun karşısına 20 m x 2.30 m ebatlarında andezit kaplamalı pano duvarı yapılmıştır.
- Yerleşkemiz içinde muhtelif yerlerde 12 adet kameriye, 20 adet pergola, 30 adet piknik masası inşa edilerek yerleştirilmiştir.
- Üniversitemiz yerleşkesine 11.310 adet muhtelif süs bitkisi fidan dikimi yapılmış, fakülte binalarımızın çevresinde 10.400 m² çim alan tesis edilmiş ve arazi ağaçlandırmasında 20.000 m² lik alanda damla sulama sistemi yapılmıştır.
- Üniversitemiz Merkez kampusunda yol iyileştirme çalışmaları ve çevre

düzenlemeleri yapılmış, Toplam 18.000 m² kilit parke imalatı 10.160 mt. bordür imalatı 21.000 m² asfalt kaplama imalatı gerçekleştirilmiştir.

- Üniversitemiz hastaneleri ile çeşitli birimlerinin makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmış ve makina teçhizat bakım onarımları yapılarak hizmete sunulmuştur.
 - Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu kitap, yayın ve abonelik işlemleri ile veri tabanı aboneliği sağlanarak hizmete alınmıştır.
 - Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaçları karşılanmıştır.
 - Taşıt Alımı projesi kapsamında arazi hizmetleri için 1 adet T08 Pic-Up kamyonet satın alınarak hizmete sunulmuştur.
- 2008 Yılı Yatırım Uygulamaları :

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2008 yılı çok yıllık yatırım projeleri stokunda üniversitemizde yıl içerisinde maliyet revizyonu yapılmamıştır. Ancak 2008 Yılı Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın ilgili maddelerine göre 2.310.129 YTL projeler arasında ödenek aktarma, 3.000.000 YTL yedek ödenek ve 561.000 YTL likit karşılığı ödenek kaydı ile toplam 12 adet projede ödenek revizyonu yapılmıştır.

2008 yıl sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Sektör	2008 Yılı Program Ödeneği	2008 Yılı Revize Ödenek	Bloke	Nakdi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	
					Program Ödeneğe Göre	Revize Ödeneğe Göre
Sağlık*	2.104	2.615	0	2.396	119,80	95,43
Eğitim	12.510	15.553	0	15.486	123,80	99,57
DKHS	300	300	0	237	79,10	79,13
Spor	50	57		57	114,20	100,00
TOPLAM	14.964	18.525	0	18.176	121,46	98,11

* 104.000 YTL'si Döner sermaye Gelirlerinden karşılanacaktır.

2008 yılı yatırım programında Eğitim sektörü içinde yer alan 11 adet projeye 12.510.000 YTL ödenek tahsis edilmiş yıl içerisinde 5736 sayılı kanun ve 30/06/2008 tarih ve 2008/30 sayılı yüksek planlama kurulu kararı gereğince tahsis edilen 3.000.000 YTL, Likit karşılığı yapılan 50.000 YTL ödenek kaydı ile birlikte toplam ödenek 15.552.887 YTL olmuştur. Tahsis edilen revize ödeneğinin tamamına yakını kullanılarak (15.485.850,65 YTL) %99,57 gerçekleştirme sağlanmıştır.

2008 yılı yatırım programında Sağlık sektörü içinde yer alan 3 adet projeye 2.000.000 YTL'si hazine yardımları 104.000 YTL'si Döner sermayeden karşılanmak üzere toplam 2.104.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 511.000 YTL ödenek ilave edilerek toplam ödenek 2.615.000 YTL olmuştur. Bu sektörde de döner sermaye hariç tahsis edilen ödeneğin 2.396.000 YTL'si kullanılarak %95,43 seviyesinde gerçekleştirme sağlanmıştır.

Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Sektöründe 2008 yılı yatırım programında Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 300.000 YTL tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek ile bilimsel araştırma projeleri desteklenerek 237.338 YTL harcanmış ve %79,13 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Eğitim-Beden Eğitimi Spor sektöründe ise 1 adet projeye 50.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde projeler arası ödenek aktarmasıyla 7.112 YTL ödenek ilave edilerek proje ödeneği toplam 57.112 YTL olmuştur. Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- 2008 yılında çok yıllık projelerimizin yılı ödeneğinin talep edilenden düşük olarak sağlanması, yatırımların zamanında hizmete alınamamasına ve yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına neden olmuştur.
- Yatırım tamamlama sürecinin uzaması eğitim-öğretim amaçlı fiziki mekan sıkıntımızı artırdığı gibi yatırım maliyetleri de her geçen yıl artmaktadır.

3. 2008 Yılı Proje Uygulamaları:

2008 YILI YATIRIMLARI PROJELERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SEKTÖR KODU	PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTCE ÖDENEĞİ 2008	DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK	BLOKE	HARCAMA	KALAN	GERÇEK LEŞME ¹ %
					KURUM İÇİ	YEDEK	LİKİT					
		YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI	14.860.000	2.310.129	2.310.129	3.000.000	561.000	18.421.000	0	18.176.596,21	244.403,79	98,67
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	2.000.000	894.180	894.180	0	511.000	2.511.000	0	2.396.245,14	114.754,86	95,43
	2008I000730	MAKİNA TEÇHİZAT- BAKIM ONARIM ²	1.000.000	70.000	394.180	0	11.000	1.335.180	0	1.220.680,77	114.499,23	91,42
	2008I000720	HASTANE BÜYÜK ONARIMI ³	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0	999.744,37	255,63	99,97
	2008I000710	HASTANE İNŞAATI ETÜD PROJE	1.000.000	824.180	0	0	0	175.820	0	175.820,00	0,00	100,00
28		EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	12.510.000	1.415.949	1.408.837	3.000.000	50.000	15.552.888	0	15.485.851	67.037,35	99,57
	1994H031910	MEDİKO SOSYAL VE SOSYAL TESİSİLER İNŞAATI	588.000	407.871	0	0	0	180.129	0	180.128,00	1,00	100,00
	1993H031860	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI	5.800.000	0	0	3.000.000	0	8.800.000	0	8.800.000	0,00	100,00
	1993H031850	REKTÖRLÜK VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000,00	0,00
	1993H031840	KAMPUS ALTYAPISI	500.000	0	318.838	0	50.000	868.838	0	867.794,15	1.043,85	99,88
	1994H031870	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAATI	3.164.000	331.468	0	0	0	2.832.532	0	2.832.531,79	0,21	100,00
	2008H033350	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	500.000	366.660	0	0	0	133.340	0	133.340,00	0,00	100,00
	2008H033360	BÜYÜK ONARIM	400.000	0	1.089.999	0	0	1.489.999	0	1.489.950,08	48,92	100,00
	2008H033370	MAKİNA TEÇHİZAT- BAKIM ONARIM	896.000	300.000	0	0	0	596.000	0	557.870,04	38.129,96	93,60
	2008H033390	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	200.000	0	0	0	0	200.000	0	180.502,07	19.497,93	90,25
	2008H033380	YAYIN ALIMLARI	400.000	0	0	0	0	400.000	0	399.779,90	220,10	99,94
	2008H033400	TAŞIT ALIMI	51.000	0	0	0	0	51.000	0	43.954,62	7.045,38	86,19
	KAMULAŞTIRMA		10.000	9.950	0	0	0	50	0	0	50,00	0,00
38		DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	300.000	0	0	0	0	300.000	0	237.388	62.611,58	79,13
	2008K120780	REKÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ⁴	300.000	0	0	0	0	300.000	0	237.388,42	62.611,58	79,13
40		EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	50.000	0	7.112	0	0	57.112	0	57.112,00	0,00	100,00
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	50.000	0	7.112	0	0	57.112	0	57.112,00	0,00	0,00

¹ Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneğe (Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.

² Döner sermayeden karşılanacak olan 50.000 YTL dahil edilmemiştir.

³ Döner sermayeden karşılanacak olan 54.000 YTL dahil edilmemiştir.



⁴ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan paylardan karşılanmıştır.

2008 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA	BÜTCE ÖDENEĞİ 2008	DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN				TOPLAM ÖDENEK	BLOKE	HARCAMA	GERÇEKLEŞME %
			KURUM İÇİ	YEDEK	LİKİT					
YATIRIM TOPLAM	14.860.000	2.310.129	2.310.129	3.000.000	561.000	18.421.000	0	18.176.596,21	98,67	
SAĞLIK SEKTÖRÜ*	2.000.000	894.180	894.180	0	511.000	2.511.000	0	2.396.245,14	95,43	
EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM**	12.510.000	1.415.949	1.408.837	3.000.000	50.000	15.552.888	0	15.485.850,65	99,57	
DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	300.000	0	0	0	0	300.000	0	237.388,42	79,13	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	50.000	0	7.112	0	0	57.112	0	57.112,00	0,00	

*Döner sermayeden karşılanacak olan 104.000 YTL dahil edilmemiştir.

**Yatırım programında proje olarak yer almayan 10.000 YTL kamulaştırma ödeneği dahil edilmiştir

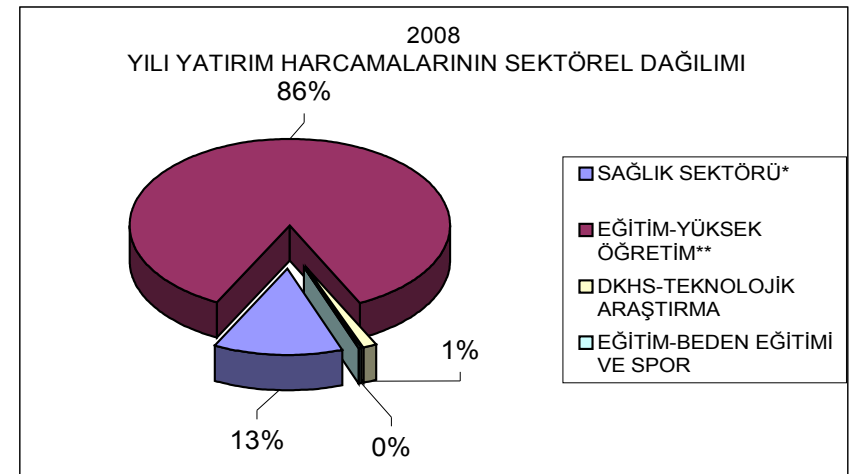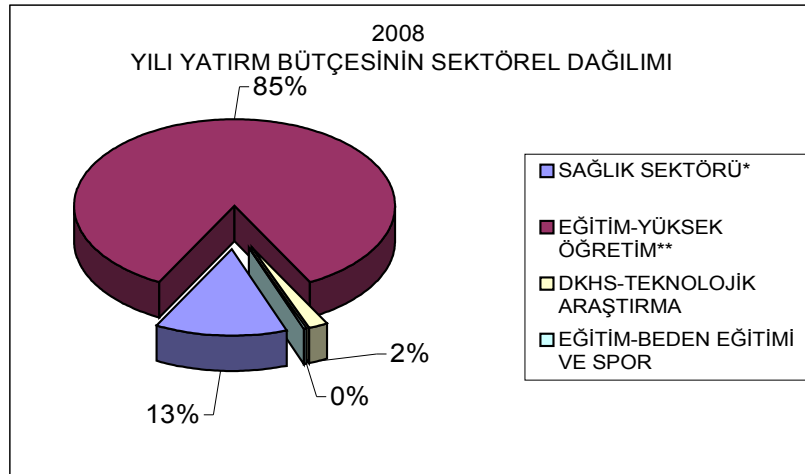

2008 YILI YATIRIMLARI PROJE VE BİRİM BAZINDA DEĞERLENDİRME

SEKTÖR KODU	PROJE NO	EKO. SINIF.		AÇIKLAMA	2008 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (1)	DÜŞÜLEN ÖDENEK (2)	EKLENEN			TOPLAM ÖDENEK (6) = 1+2+3+4+5	BLOKE (7)	HARCAMA (8)	KALAN (9)=6-7-8	GERÇEK LEŞME %
		I	II				KURUM İÇİ (3)	YEDEK (4)	LİKİT (5)					
				YATIRIMLAR TOPLAMI	14.860.000	2.310.129	2.310.129	3.000.000	561.000	18.421.000	0	18.176.596,21	244.403,79	98,67
10				SAĞLIK SEKTÖRÜ	2.000.000	894.180	894.180	0	511.000	2.511.000	0	2.396.245,14	114.754,86	95,43
	2008D00730			DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	150.000	0	0	0	0	150.000	0	144.167,10	5.832,90	96,11
		06	1	MAMUL MAL ALIMLARI ¹	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0	144.167,10	5.832,90	96,11
				UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	1.850.000	894.180	894.180	0	511.000	2.361.000	0	2.252.078,04	108.921,96	95,39
	2008D00730	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI ¹	350.000	0,00	394.180,00	0,00	11.000,00	755.180	0	701.930,59	53.229,41	92,95
	2008D00710		3	HASTANE İNŞAATI ETÜD PROJE	1.000.000	824.180,00	0,00	0,00	0,00	175.820	0	175.820,00	0,00	100,00
	2008D00730		6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	500.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000	0	374.563,08	55.436,92	87,11
	2008D00720		7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ²	0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000	0	999.744,37	255,63	99,97
28				EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	12.510.000	1.415.949	1.408.837	3.000.000	50.000	15.552.888	0	15.485.850,65	67.037,25	99,57
				İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.096.000	300.000	0	0	0	796.000	0	738.372,11	57.627,89	92,76
	2008H033370	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	876.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000	0	538.457,79	37.542,21	93,48
	2008H033390	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000	0	160.793,57	19.206,43	89,33
	2008H033390		3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	19.708,50	291,50	98,54
	2008H033370		6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	19.412,25	587,75	97,06
	2008H033380			KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞ	400.000	0	0	0	0	400.000	0	399.779,90	220,10	99,94
		06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0	399.779,90	220,10	99,94
				SAĞLIK KÜLTÜR SPOR ve DAİRESİ BAŞKANLIĞI	639.000	407.871	0	0	0	231.129	0	224.083	7.046,38	96,95
	2008H033400	06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000	0	43.954,62	7.045,38	86,19
	1994H031910	06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	588.000	407.871	0,00	0,00	0,00	180.129	0	180.128,00	1,00	100,00
				YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	1.411.000	376.610	1.408.837	0	50.000	2.493.227	0	2.491.084	2.142,77	99,91
	2008H033350	06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	500.000	366.660	0	0	0	133.340	0	133.340,00	0,00	100,00
	KAMULAŞTIRMA	06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	10.000	9.950	0	0	0	50	0	0,00	50,00	0,00
	1993H031840	06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	500.000	0,00	318.838,00	0,00	50.000,00	868.838	0	867.794,15	1.043,85	99,88
	1993H031850	06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00	0,00
	2008H033360		7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	400.000	0,00	1.089.999,00	0,00	0,00	1.489.999	0	1.489.930,08	48,92	100,00
	1994H031870			MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	3.164.000	331.468	0	0	0	2.832.532	0	2.832.531,79	0,21	100,00
		06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.164.000	331.468,00	0,00	0,00	0,00	2.832.532,00	0	2.832.531,79	0,21	100,00
	1993H031860			İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	5.800.000	0	0	3.000.000	0	8.800.000	0	8.800.000,00	0,00	100,00
		06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.800.000	0,00	0,00	3.000.000	0,00	8.800.000	0	8.800.000,00	0,00	100,00
38				DKHS-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	300.000	0	0	0	0	300.000	0	237.388,42	62.611,58	79,13
				ÖZEL KALEM(Bilimsel Araştırma Birimi)	300.000	0	0	0	0	300.000	0	237.388,42	62.611,58	79,13
	2008k120780			REKÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ³	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0	237.388,42	62.611,58	79,13
		06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0	237.388,42	62.611,58	79,13
40	1997H050180			EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	50.000	0	7.112	0	0	57.112	0	57.112,00	0,00	100,00
				SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	50.000	0	7.112	0	0	57.112	0	57.112,00	0,00	100,00
		06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	50.000	0,00	7.112,00	0,00	0,00	57.112	0	57.112,00	0,00	100,00

¹ Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneğe(Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır

² Döner sermayeden karşılanacak olan 50.000 YTL dâhil edilmemiştir.

³ Döner sermayeden karşılanacak olan 54.000 YTL dâhil edilmemiştir.

⁴ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan paylardan karşılanmıştır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1. 2008I000730 Makine ve Teçhizat Alımı Projesi :

2008 Yılı Yatırım Programında 50.000 YTL'si döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere toplam 1.050.000 YTL ile yer alan projeye; Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine teçhizat alımı için 350.000 YTL, makine teçhizat bakım onarımı için 500.000 YTL, Diş Hekimliği Fakültesinin makine teçhizat alımı için 150.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine teçhizat alımlarına, 2008I000710 numaralı Hastane İnşaatı Etüd Projesinden kalan miktardan 324.180 YTL ödenek aktarması ve 11.000 YTL likit karşılığı ödenek kaydı ile yapılan ödenek revizyonları sonucu proje ödeneği 1.385.180 YTL'ye ulaşmıştır.

Proje kapsamında;

Diş Hekimliği Fakültesine tahsis edilen 150.000 YTL ödenek 144.167.TL'si kullanılarak, fakültenin klinikleri ve laboratuvarı için 4 adet diş ünitesi, 1 adet periapikal, diş röntgen cihazı, film banyo cihazı, ortodontik tedavi ve cerrahi el aletleri, periodontal muayene ve tedavi klinik el aletleri, protez laboratuvarı cihaz ve malzemeleri, cerrahi el aletleri, protez laboratuvarı cihaz ve el aletleri, klinik muayene ve tedavi el aletleri, laboratuvar cihazları (93 kalem tıbbi demirbaş el aletleri ve cihazları) satın alınmış ve hizmete sunulmuştur.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin mamul mal alımlarına 350.000 YTL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda hastane inşaatı etüd projesinden kalan 405.180 YTL'lik aktarma ile 755.180 YTL olmuştur. Bu ödeneğin 701.951 YTL'si kullanılarak; 1 adet 50 kg'lık çamaşır yıkama makinesi, 1 adet 2000 Tab. kapasiteli bulaşık yıkama makinesi, 69 adet klima, 4 adet kesintisiz güç kaynağı, 5 adet tekerlekli sandalye, 33 adet çalışma koltuğu, 7 adet buzdolabı, 1 adet otomatik bariyer sistemi, 2 adet banko masa, 1 adet tam otomatik tam kapalı doku takip cihazı, 15 adet hastabaşı monitörü, 52 adet bilgisayar, 4 adet ameliyathane hasta transfer sedyesi, 4 adet cerrahi aspiratör, 4 adet kanepeler, 2 adet defibrilatör, 1 adet pulseoksimetre, 1 adet dik otoklav, 1 adet cerrahi delici motor sistemi, 5 adet komodin, 5 adet refakatçi koltuğu, 5 adet karyola, 6 adet 4 motorlu karyola, 11 adet yoğun bakım yatağı, 10 adet üçlü bekleme koltuğu, 30 adet çalışma masası, 11 adet yemek servis masası, 5 adet dosya dolabı, 5 adet elbise dolabı, 1 adet ekokardiografi cihazı, 1 adet yoğun bakım küvözü, 1 adet fototerapi cihazı alımı için harcanmıştır. 53.229 YTL ödenek ise cerrahi el aletleri ihalesinin iptali sonucu kullanılamamıştır.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin makine teçhizat bakım onarımları için 500.000 YTL tahsis edilmiş olup, 70.000 YTL'si yıl içerisinde makine teçhizat alımlarına aktarılmıştır. Kalan 430.000 YTL ödeneğin; 374.563 YTL'si MRI(Magnetik Rezonans Cihazı), anjiyografi cihazı, skopi cihazı, röntgen cihazları, endoskopi cihazları, ameliyathane klima havalandırma sistemi, anestezi cihazları, ultrasonografi cihazları ve hastanemizde mevcut diğer cihazların bakım onarımı, sözleşme ve yedek parça bedellerinin ödenmesi için kullanılmıştır.

2. 2008I000720

Hastane Büyük Onarımı Projesi:

Proje 2008 Yılı Yatırım Programında bedeli döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 54.000 YTL ödenek ile yer almıştır. Projenin mevcut ödeneği ile hastane büyük onarımının yapılması mümkün olmadığından, yıl içerisinde projeye 500.000 YTL likit karşılığı ödenek kaydı ve 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre; hastane 2008I000710 numaralı Hastane İnşaatı Etüd Projesinden kalan miktardan da 500.000 YTL aktararak kullanılmıştır

Proje kapsamında hastane ısıtma sistemi sıvı yakıttan, doğalgaza dönüştürüldü, mevcut kazanlar yerine yüksek verimli döküm kazanların montajı yapıldı, kullanım suyu sıcak su hatları tüm hastanede işler duruma getirildi. Böylece ısıtma maliyetleri düşürüldü, çevre kirliliği yapan sistemden çevre dostu sisteme geçildi.

Hastanemizin iç duvar ve tavanlarının sıva tamiratları yapılarak bütün iç yüzeyler anti baktariyel boya ile boyandı. Tüm WC'lerin zeminleri döşeme betonlarına kadar söküldü su yalıtım imalatları yeniden yapıldı seramik imalatları kompakt laminant bölme imalatları tamamlandı bazı wc ler bölünerek banyo ya dönüştürüldü tüm wc lere havalandırma aspratörleri takıldı. Bina merdiven kovanına dışarıdan bağlantılı dört duraklı dört kişilik insan asansörü yapılarak eklendi.

Hastane binasının üç katının alüminyum pencere doğramaları sökülerek ısı yalıtımlı PVC doğramalar takıldı. Yangın merdiveni kapıları sökülerek PVC kapılarla değiştirildi. İç bahçe alanı PVC doğramalarla kapatılarak yeni hasta kabul mekanları kazanıldı.

Hastane binasının çatı tamiratları, dış cephe siding kaplamaları, bodrum ve zemin katın parlak granit kaplamaları, zemin kat pencerelerinin PVC ye dönüştürülmesi ile toplam 7 adet ameliyathanenin kapılarının yenilenmesi işleri yapılmıştır.

3. 2008HI000710 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programında 1.000.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi projesi ihale edilerek 175.820 YTL sözleşmesi yapılmış yıl sonu itibari ile tamamlanmıştır. Böylece 2009 yılı içinde başlatılacak olan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı yapım işinin proje ve maliyet hesapları hazırlanmıştır.

Bu projeden artan 824.180 YTL ödeneğin 324.180 YTL'si Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine Teçhizat Alımı projesine, 500.000 YTL'de Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarımı projesine 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre aktararak kullanılmıştır.

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

4. 2008H033370 Makine ve Teçhizat Alımı Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programı ile 896.000 YTL ödenek tahsis edilen projeden yıl içerisinde 300.000 YTL'si Üniversitemizin 2008H033360 numaralı Büyük Onarım projesine aktarılmıştır. Kalan 586.000 YTL ödenekten 557.870 YTL harcanarak; 35 adet bilgisayar, 1 adet note book, 1 adet server, metro internet hız artırımı için malzeme, 18 adet projeksiyon cihazı ve perdesi, format renkli yazıcı, 20 adet mikroskop, baskı makinası, 5 adet eldedektörü ve kapı dedektörü, ağaç dikimi için çukur açma makinası, statik dinamik eğitim seti, ısı iletkenlik ölçüm cihazı, otomatik vikat, win gate tets sistemi, akıllı tahta, piyano, fax, yazıcı, okul mefruşatı (sandalye, masa, tahta), 218 adet konferans sandalyesi, trinoküler mikroskop ve çeşitli birimlerin ihtiyaçları olan labaratuvar malzemeleri ile makine teçhizat satın alınarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanılmakta olan makine teçhizatların bakım onarımları yapılmıştır.

5. 2008H033390 Bilgi Teknolojileri Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programı ile 200.000 YTL ödenek tahsis edilen proje kapsamında Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan internet bağlantısı, 155 adet bilgisayar, 20 adet yazıcı, 166 adet monitor alımı için proje ödeneğinin %90'ı kullanılarak 180.502,07 YTL'si harcanmıştır.

6. 2008H033380 Yayın Alımı Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programı ile 400.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında ödeneğin 399.779,90 YTL'si kullanılarak Üniversitemiz kütüphanesinin ihtiyacı olan 7.012 adet yerli ve yabancı kitap satın alma, 47 adet süreli yayın işlemleri ile 11 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

7. 2008H033400 Taşıt Alımı Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programı ile projeye 51.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında 43.954,62 YTL ödenek harcanarak; arazide kullanılmak üzere Veteriner Fakültesine 1 adet 4*4 T-08 Pic-Up taşıt satın alınmış ve hizmete sunulmuştur.

8. 1994H031910 Mediko-Sosyal ve Sosyal Tesisler İnşaatı Projesi:

2008 Yılı Yatırım ödeneği olarak 588.000 YTL tahsis edilmiş bu ödeneğin 180.128 YTL'si harcanarak sözleşmesi tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur. Proje ödeneğinden kalan 408.000 YTL ödenek, 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre 206.079 YTL'si 2008H033360 numaralı Büyük Onarım projesine, 194.680 YTL'si 1993H031840 numaralı Kampus Altyapısı Projesine, 7.112 YTL'si ise 1997H050180 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine aktararak kullanılmıştır.

9. 2008H033350 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programında 500.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Veteriner Fakültesi projesi ihale edilmiş olup, 133.340 YTL'sına sözleşmesi yapılarak etüd projesi tamamlanmıştır. Bu projeden kalan 366.660 YTL ödenek; 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre; 252.452 YTL'sı 2008H033360 numaralı Büyük Onarım projesine, 114.208 YTL'si de 1993H031840 numaralı Kampus Altyapı projesine aktarılarak kullanılmıştır.

10. 1993H031840 Kampus Altyapısı Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programında ödenek olarak 500.000 YTL tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kaydı ile 50.000 YTL ilave ödenekle toplam ödenek 550.000 YTL yükseltilmiş, 2008H033350 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinden kalan 114.208 YTL, 1994H031910 numaralı Mediko-Sosyal ve Sosyal Tesisler İnşaatı Projesinden kalan 194.680 YTL ve Kamulaştırma ödeneğinden kalan 9.950 YTL olmak üzere toplam 318.868 YTL ödenek, 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre projeye aktarılarak yılı içi harcanabilir ödenek miktarı 869.838 YTL'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten 867.794,15 YTL harcanmıştır. Kırıkkale Belediyesi ile birlikte çalışarak temin ettiğimiz bitüm ile kampus içi ana ulaşım yolumuz çift yol haline getirilmiş her iki yolun yol sınır bordürleri belediye tarafından bedelsiz olarak temin ve inşa edilmiş her iki şerit yine belediyesi tarafından asfaltlanmıştır.

Devamında yapılan kampus altyapısı inşaatı birinci kısım ihalesi kapsamında kampus ana ulaşım yolu iki yanındaki tüm yaya kaldırımları yerleşkemizde yer alan binalar arası ara ulaşım yolları, otoparklar, meydanlar, gölet çevresi gezi yolları orta refüj düzenlemeleri ve refüj boyunca aydınlatmalar, kara yollarından temin edilen trafik düzenleme işaret levhaları yapımı tamamlanmıştır.

Kalan ödenekle yapılan kampus altyapısı inşaatı ikinci kısım ihalesi ile imalatlara devam edilerek galeri içinden 1.500 mt. 90 mm çaplı Galvaniz boru isale şebekesi ile 300 mt. 65 mm çaplı plastik su şebekesi imatları 100 m³ lük modüler su deposu ile hidrofor sistemi yapılmıştır. Toplam 18.000 m² kilit parke imalatı, 10.160 mt. bordür imalatı, 21.000 m² asfalt kaplama imalatı fiziki varlığımıza eklenmiştir. Ayrıca kampus içi yeşil alanlarımızın sulanması için otomatik sulama şebekesi 21.330 m² alan içinde inşa edilmiştir.

11. 1993H031850 Rektörlük Binası-Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesi:

2007 Yılı Yatırım Programında iz ödenek olarak 1.000 YTL tahsis edilmiştir. İhale şartlarının gerektirdiği başlangıç ödeneği sağlanamadığından 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin b fıkrasına göre; proje ödeneğinin 950 YTL'si 1993H031840 numaralı Kampus Altyapı projesine aktarılarak kullanılmıştır.

2008 Yılı Yatırım Program ödeneği 400.000 YTL tahsis edilmiş, 18 Ekim 2007 tarih ve 26674 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Kararının 5. maddesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiştir. Dönem içinde ihtiyaca binaen Rektörlük Makine Teçhizat ödeneğinden 300.000 YTL ödenek aktarımı yapılarak yılı ödeneği 700.000 YTL'ye çıkarılmış, bu projedeki ödenek ihtiyacı devam ettiğinden yılı içinde Projeleri tamamlanan Mühendislik Fakültesi inşaatından artan 331.468 YTL, Mediko Sosyal ve Sosyal Tesisler İnşaatından artan 206.079 YTL ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden (Eğitim) artan 252.452 YTL toplam 789.999 YTL daha ödenek aktarımı yapılarak yılı aktarılan toplam ödenek miktarı 1.089.999 YTL olarak gerçekleşmiştir. Yılı harcanabilir ödenek miktarı 1.489.999 YTL'ye ulaşmış, durum gereği yeniden detay programı düzenlenerek ihaleleri yapılmış ve 1.489.950,08 YTL harcanmıştır.

Büyük onarım için sağlanan ödenekten aşağıda sıralanan yapım işleri ihaleleri yılı içinde sonuçlandırılmıştır.

1. Eğitim, Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlıklarının büyük onarım işi kapsamında; 73.632 YTL harcanarak, Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerimizin otomatik sulama imalatları Mühendislik Fakültemizin kalorifer radyatörlerin gerek görülenleri değişmesi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı binasının çatı olukları, boya işleri, zemin granit kaplama işlerinin yapılması, Merkezi Kütüphane binasının bina içi alüminyum bölme ve boya işleri ile fotoselli otomatik kapı imalatları yapılmıştır.
2. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü büyük onarım işi kapsamında; 78.706 YTL harcanarak, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Binalarının kalorifer boru tesisatlarının tamamen yenilenmesi, bina çatı oluk ve iniş boruları tamiratlarının yapılması, Atatürk büstü mermerlerinin yenilenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Binasının idari kısım duvarları alçı sıva ve boya ile girişteki parapet üstü su izolasyon yalıtımlarının yapılması ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çevresinde 16.013 m²'lik yeşil alan için otomatik sulama sistemi yapılmıştır.
3. Keskin Meslek Yüksekokulu, Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu ile Eski Rektörlük Binası büyük onarım işi kapsamında; 57.112 YTL harcanarak, Keskin Meslek Yüksekokulu derslik kapıları çelik kapı olarak yenilendi çevre ihatası tel örgü imalatlarının yapılması, ısı merkezi kalorifer kazanı değiştirilerek yenilenmesi, nizamiye girişine kollu motorlu bariyer takılması, Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu Binası çatısına ısı izolasyonu için cam yünü serilmesi ve zemin kat pencerelerine korkuluklarının takılması ile eski Rektörlük binası çatı olukları ile yağmur iniş boruları tamiratları ve bina içinde dört adet odanın boyasının yapılması gerçekleştirildi.
4. 4-Kırıkkale Meslek Yüksekokulu büyük onarım yapım işi kapsamında; 51.271 YTL harcanarak, Meslek Yüksekokulu önündeki meydan kilit parke ile Cumhuriyet Salonu önündeki meydan ve merdivenler andezit kaplama yapıldı,

Meslek Yüksekokulu içi yaya allesi ile eski öğrenci işleri binasının boyalarının yapılması, çatı olukları ile yağmur iniş boruları yenilenmesi ile yaya allesinden dersliklere ve elektrik laboratuvarına geçiş koridorlarının üzerindeki su yalıtımları yapıldı. Ayrıca bedeli öz gelirlerimizden karşılanarak Cumhuriyet Salonunun fuaye ve koridorlarının zemin kaplama işleri yapılarak salon giriş kapısı yeniden düzenlendi, girişe fotoselli otomatik kapı takılarak tamamlanmıştır.

5. Merkezi Yemekhane ile Veteriner Fakültesi büyük onarım yapım işi kapsamında; 74.753 YTL harcanarak, Merkezi Yemekhane için yer ve duvar seramikleri, elektrik tesisatları tamamen yenilendi, Havalandırma tesisat kanalları yapıldı, Aspiratörü takıldı. Veteriner Fakültesinin taşındığı eski Beden Eğitimi Binasına tezgahları ile su elektrik ve LPG tesisatları ile laboratuvar yapıldı. Ayrıca girişte PVC bölme imalatı yapılmıştır.
6. Kampus Isı Merkezinin doğalgaza dönüşüm işi kapsamında; 335.120 YTL harcanarak, Kampus de yer alan fakülteler ile idari ve sosyal binalarımız, kütüphane, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binamız gibi tüm eğitim ve öğretim tesislerimizin ısınma enerjisi önceden pahalı olan kalorifer yakıtı kullanarak temin edilirken, oldukça yüksek maliyetli bu yakıttan daha ucuz olan Doğalgaz kullanarak ısınma enerjisi temin edilmesi için sistem dönüşümü, ilave 1 adet doğalgaz kazanı konulması mevcut kazanlara 3 adet doğalgaz yakıcı brülörler ilavesi, ileride eklenecek kazanlar için gaz şebekesinin şimdiden montajı, paslanmaz çelik baca imalatı ve kapasite büyümesine karşı eklenecek baca içinde kaide ve ankraj işleri yapılmıştır.
7. Dış Hekimliği Fakültesi büyük onarım işi kapsamında; 536.310 YTL harcanarak, Kırıkkale, Ahılı Tapulama sınırları içinde kalan Milli Savunma Bakanlığında tahsis yolu ile edindiğimiz 750 dönümlük arazi içinde yer alan binalardan üç katlı 2.400 m²'lik bir bina Dış Hekimliği Fakültemiz için hizmet binası olarak hazırlanmak üzere çatı tamiri, yağmur olukları ve yağmur iniş boruları yenilenmesi, sıva etekleri galvanize saç imalatları yenilendi. Bina içi yıkım ve yeni bölümler oluşturulması sıva boya yapımı ve tamirleri derslik, laboratuvar, ameliyathane mekanlarının düzenlenmesi, binanın tüm kapı ve pencere doğramalarının sökülmesi bunların yerine PVC pencere ısı yalıtımlı laminat kapılar takıldı, bina dış cephe sıva tamirleri ve boyası ile bina girişi ve çevresi renkli karosimon kaplamaları mozaik karo tretuvar imalatları yapıldı. Ayrıca binanın tüm elektrik ve sıhhi tesisat sistemi yenilenmiştir.
8. Açık Spor Tesisleri büyük onarım işi kapsamında; 68.794 YTL harcanarak, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde kampus içi ulaşım yolu kenarında önceden spor sektörü ödeneğinden yapılan 2 adet basketbol sahasının çevre fens teli imalatları ile plaj futbolu sahasının dolgu eteklerini tutacak istinat perde duvarlarının imalatları yapılmıştır.
9. Merkezi Kafeterya ile Merkezi Kütüphane büyük onarım işi kapsamında; 72.924 YTL harcanarak, Merkezi Kafeterya binasındaki öğrenci kantini kısmına 100 m² ek bina yapımı ve Merkezi Kütüphane eteklerine 50 cm yükseklikte andezit kaplama işleri yapılmıştır.

10. B-Kapısı, Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı büyük onarım işi kapsamında; 116.702 YTL harcanarak, önceden yaptırılan kreş (anaokulu) binamızın çocuk oyun salonu kısmına 100 m² ilave bina ile 25 m² tesisat binası ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı binasının dış cephe ısı tecritli 300 m² siding kaplamaları ile split klima konulması işleri yapılmıştır.

13. 1993H031860 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Projesi:

2008 Yılı Yatırım ödeneği olarak 5.800.000 YTL tahsis edilmiş, Yüksek Planlama Kurulunun 30/06/2008 tarih ve 2008/30 sayılı kararınca 3.000.000 YTL ilave ödenek tahsis edilerek toplam ödenek 8.800.000 YTL' sına yükseltilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanarak; 2008 yılı sonu itibari ile teslim alınıp eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılacak hale getirildi. Sözleşmesi 2009 yılı Ocak ayında tamamlanacak olan projenin geçici kabulü yapılarak hizmete alınacaktır.

14. 1994H031870 Mühendislik Fakültesi Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programı ile 3.164.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneğin 2.832.532 YTL'sı harcnarak proje tamamlanmış eğitim-öğretim hizmetine sunulmuştur. Proje ödeneğinden kalan 331.468 YTL 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre 2008H033360 numaralı Büyük Onarım projesine aktarılarak kullanılmıştır.

EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

15. 1997H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

2008 Yılı Yatırım Programında 50.000 YTL ödenek tahsisi yapılmış, yıl içerisinde diğer Mediko Sosyal ve SosyalTesisler projesinden kalan miktardan 7.112 YTL, 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin b fıkrasına göre aktarılarak proje ödeneği 57.112 YTL'ye ulaşmıştır. Proje kapsamında toplam ödeneğin tamamı harcanarak 4 adet basketbol, 1 adet plaj futbolu sahası imalatları yapılmıştır.

DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

16. 2007K120780 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

2008 Yılı Yatırım Programı ile projeye Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen Döner Sermaye İşletmesi

gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 300.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında tahsis edilen ödenekten 237.388,42 YTL harcanarak 2008 yılında neticelenmesi mümkün olan 24 adet projenin tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

KAMULAŞTIRMA:

2008 Yılı Yatırım Programında proje olarak yer almayan kamulaştırma bedelleri için 10.000 YTL ayrılmış olup, şartlarının gerektirdiği ödenek sağlanamadığından harcama yapılamamıştır. Kamulaştırma ödeneğinin 9.950 YTL 2008 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi b fıkrasına göre 1993H031840 numaralı Kampus Altyapı projesine aktarılarak kullanılmıştır.

2007 yılı sonlarında işlemleri tamamlanan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli askeri amaçla kullanılan Kırıkkale / Ahili mevkiindeki arazilerden 707 dönüm kadarı 2008 yılı başlarında tahsis edinilmiştir.

Kırıkkale / Delice ilçe Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında lojman olarak kullanılan binalardan 4 katlı 1 adet bina Delice Meslek Yüksekokulu binası olarak edinildi. Ayrıca Delice’ de organik tarım amaçlı uygulamalar için 76.500 m² miktarında 1 adet tarla tahsisen elde edilmiştir.

4. Öneriler :

- Bütçeden ayrılan ödenekler reel anlamda artırılmalı.
- İnşaat projelerine planlanan sürede bitirilebilecek düzeyde ödenek verilmeli.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**Bütçe Türü:** Özel Bütçe.....

2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2007 Sonu Kümülatif Harcama			2008 Yılı Program Ödenek			2008 Yılı Revize Ödenek			2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma -Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	12		108.089			89.177			12.550		3.050	15.600			15.543
Sağlık*	3		2.104						2.104		511	2.615			2.396
Diğer Kamu Hizmetleri	1		300						300			300			237
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	16		110.493			89.177			14.954		3.561	18.515			18.176

* Döner Sermayeden karşılanacak olan 104.000 YTL dahil edilmiştir.
