



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2012 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Mart 2013**



YÖNETİCİ ÖZETİ

Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması yasal bir zorunluluktur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kaynakların değerlendirilmesinde hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüştür. Kamu harcamalarında kaynakların zamanında sağlanması ve yerinde ve gerektiği ölçüde kullanılması esastır. İnşa edilen yapıların, alınan demirbaş, makine ve teçhizatın bir ekonomik ömrü vardır. Başlanılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, beklenen fayda ve verimin alınamamasına neden olduğu gibi ekonomik ömürlerinin kısalmasına ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda son yıllarda faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmıştır. 2012 yılında kullanılan toplam kaynakların sektör bazında %56'sını eğitim, %42'sini sağlık ve %2'sini teknolojik araştırmalar ile ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Yapılan yatırımlarda daha kaliteli bir eğitim-öğretime zemin hazırlayan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemizde 2012 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödenekler ve ilave edilen ödeneklerin tamamına yakını kullanılarak büyüme ve gelişme yönünde önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. Genel Değerlendirme	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	2
1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	2
1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:	3
2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları.....	7
2.1 Devam Eden Projeler.....	7
2.1.1 1993H031850 – Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatı Projesi (Eğitim Sektörü).....	7
2.1.2 1993H031640 – Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Sektörü)	8
2.1.3 1993H031840 – Kampüs Altyapısı (Eğitim Sektörü)	8
2.1.4 1997H050180 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Sektörü).....	9
2.1.5 2009K120910 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH Sektörü)	9
2.2 Tamamlanan Projeler.....	9
2.2.1 2012H32310 – Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü).....	9
2.2.2 2012H32300 – Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Eğitim Sektörü).....	15
2.2.3 2012K120800 – Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (DKH Sektörü).....	15
2.2.4 2012I000600 – Kesin Hesap Farkı (Sağlık Sektörü).....	15
2.2.5 2012I000430 – Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)	16

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programında Eğitim Sektörü için 24.000.000,00 TL¹, Sağlık Sektörü için 20.750.000,00 TL, Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü için 1.310.000,00 TL ve Yükseköğretim-Spor Sektörü için 200.000,00 TL olmak üzere toplam 46.260.000,00 TL kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynağın 45.010.000,00 TL'sinin hazine yardımlarından, 200.000,00 TL'sinin öz gelirlerden, 750.000,00 TL'sinin döner sermaye gelirlerinden ve 300.000,00 TL'sinin de 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesi çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik paydan karşılanması öngörülmüştür.

Yıl içerisinde yatırım programına Kesin Hesap Farkı adıyla yeni bir proje alınmış, 1.532.108,00 TL'lik gideri likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak sağlanmıştır. Ayrıca yıl içerisinde ortaya çıkan durumlara bağlı olarak diğer projelerde de ödenek değişikliği yapılmak durumunda kalınmıştır. Bu kapsamda diğer projelere toplam 2.455.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca kamulaştırma işlemlerine ilişkin ilama istinaden 13.782,10 TL ödeme yapılmış ve bu tutar da likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle karşılanmıştır.

Bunun yanı sıra yeni yapılan hastanemizin faaliyete geçebilmesi için tamamlanması zorunlu olan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi çerçevesindeki Morfoloji Binası için de Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli görüşmeler yapılarak toplam 5.000.000,00 TL 2012 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7. maddesi çerçevesinde yedek ödenekten (Yatırımları Hızlandırma Ödeneği) karşılanmıştır.

Yılsonu itibariyle bakıldığında 2012 yılı kaynağı toplam 55.260.890,10 TL'ye ulaşmış olup bu kaynağın 50.010.000,00 TL'si Hazine Yardımlarından, 4.187.108,00 TL'si Üniversitemiz kaynaklarından ve 1.050.000,00 TL'si de Döner Sermaye gelirlerinden sağlanmıştır.

Açıklama	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Kaynak
Hazine Yardımı	45.010.000,00	50.010.000,00
Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karş. öd.) ¹	200.000,00	4.200.890,10
Döner Sermaye ²	1.050.000,00	1.050.000,00
Toplam	46.260.000,00	55.260.890,10
¹ Kamulaştırma için eklenen 13.782,10 TL toplama dahildir		
² Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay grubu dahildir.		

¹ Kamulaştırma için tahsis edilen 2.000,00 TL tutara dahildir. Kamulaştırmaya ilişkin ödenek ve harcamalar proje olarak yatırım programlarında yer almadığından sadece bu başlık altında değinilmiş olup projelere ilişkin tablolarda ayrıca değinilmeyecektir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

YERLEŞKE ADI	Arazi (da)	Eğitim- Öğretim Binaları (m ²)	Hizmet Binaları (m ²)	Genel Hizmet Alanları (m ²)	Spor Sahaları (m ²)
Yahşihan Yerleşkesi	22.000	162.891	23.746	1.636.870	20.046
Tıp Fakültesi	0	23.300	88.250	0	0
Sağlık Yerleşkesi	707	0	2.400	0	0
Keskin Yerleşkesi	875	2.936	6.059	0	1.796
Delice Yerleşkesi	84	1.500	1.550	0	0
Bahşılı Yerleşkesi	10	4.258	0	0	0
Hacılar Yerleşkesi	2	1.172	0	0	0
TOPLAM	23.678	196.057	122.005	1.636.870	21.842

1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programına alınan 9 tane projesiyle, misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 2012 Yılı Yatırım Programında eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 1 adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 adet ve spor sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 9 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekan ile binaların yapımı hedeflenmiştir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz bütçesine konulan ödenekler kullanılarak;

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; yatırım programında öngörülen ödeneye göre %122, revize ödeneye göre ise %94'lük bir gerçekleştirme sağlanarak Üniversitemiz çeşitli bakım-onarım, yayın alımları, makine-teçhizat alımları, büyük onarım ve taşıt alımı gibi ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt projesi kapsamında; yatırım programı ödeneğine göre %227, revize ödeneye göre ise %99'luk gerçekleştirme sağlanan proje ile Üniversitemiz Yahşihan Yerleşkesine yapılması planlanan 20.000 m² Dış Hekimliği Fakültesi Binasının etüt proje işi gerçekleştirilmiştir.

Rektörlük Binası ve Fen Edebiyat Fakültesi Projesi; hedeflendiği gibi yatırım programında tahsis edilen ödeneğin tamamı kullanılmıştır. 2013 yılı başında Rektörlük Binasının hizmete açılması planlanmaktadır.

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi; yatırım programında öngörülen ödeneye göre %142, revize ödeneye göre ise %100'lük bir gerçekleştirme sağlanmıştır. Ödenekler 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 2013 yılı içerisinde faaliyete geçebilmesi için hayati önem taşıyan Morfoloji Binasının yapımının tamamlanmasında kullanılmıştır.

Kampüs Altyapı Projesi; yatırım programı ödeneğine göre %109, revize ödeneye göre %100'lük bir gerçekleştirme sağlanan proje ile Yahşihan Yerleşkesi içerisinde ring yolu yapılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; yatırım programı ödeneğine göre %96'lık bir gerçekleştirme sağlanmıştır. Hedeflendiği gibi spor alanlarının bakımları ve eksikliklerinin tamamlanması gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü); yatırım programı ödeneğine göre %73, revize ödeneye göre ise %69'luk bir gerçekleştirme sağlanmıştır. 2013 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine-teçhizat alımları ile Dış Hekimliği Fakültesinin makine-teçhizat ihtiyaçları ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Projesi; proje kapsamında hedeflendiği gibi Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının geliştirilmesine devam edilmiştir. Özel hesaba aktarılarak kullanılan kaynakların program ödeneye göre %78'i kullanılmıştır.



1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:

SEKTÖRLER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör Kodu	AÇIKLAMA	2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan
			Kurum İçi	Yedek	Likit				
	YATIRIMLAR TOPLAMI	45.508.000,00	3.000,00	5.000.000,00	3.987.108,00	3.000,00	54.495.108,00	47.516.254,03	6.807.704,94
10	SAĞLIK SEKTÖRÜ	20.000.000,00	0,00	0,00	2.692.108,00	0,00	22.692.108,00	16.189.506,50	6.502.601,50
28	EĞİTİM SEKTÖRÜ ¹	23.998.000,00	3.000,00	5.000.000,00	1.295.000,00	3.000,00	30.293.000,00	29.995.556,56	297.443,44
38	DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA ²	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.138.850,97	0,00
40	EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.340,00	7.660,00

¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek ayrılmış gelir gerçekleşmediğinden tutara eklenmemiştir.

²Bu sektördeki projelerin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

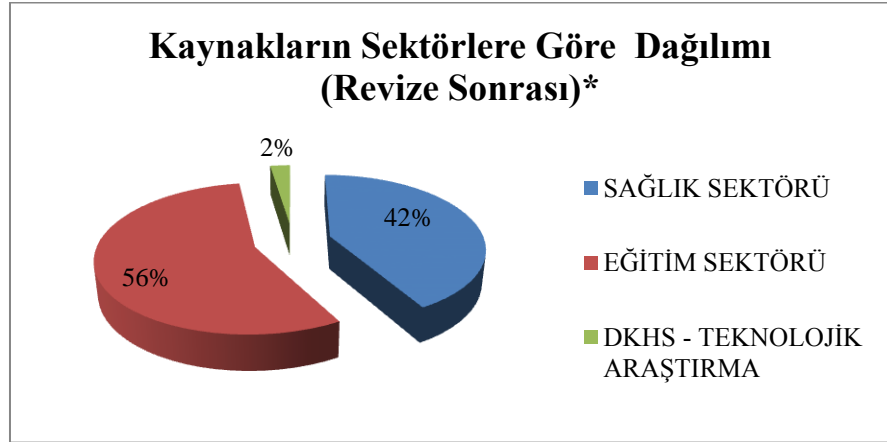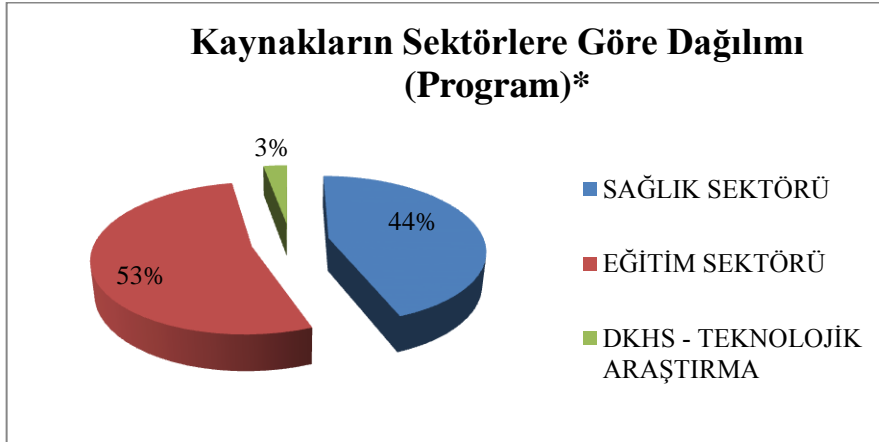

*Spor Sektörü için tahsis edilen 200.000,00 TL, kaynaklar itibarıyla %0,004'lük bir orana sahip olduğundan grafikte ihmal edilmiştir.

PROJELER İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör Kodu	Proje No	AÇIKLAMA	2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan
				Kurum İçi	Yedek	Likit				
		YATIRIMLAR TOPLAMI	45.508.000,00	3.000,00	5.000.000,00	3.987.108,00	3.000,00	54.495.108,00	47.516.254,03	6.807.704,94
10		SAĞLIK SEKTÖRÜ	20.000.000,00	0,00	0,00	2.692.108,00	0,00	22.692.108,00	16.189.506,50	6.502.601,50
	2012I000430	MUHTELİF İŞLER ¹	20.000.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	21.160.000,00	14.657.398,50	6.502.601,50
	2012I000600	KEŞİN HESAP FARKI	0,00	0,00	0,00	1.532.108,00	0,00	1.532.108,00	1.532.108,00	0,00
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	23.998.000,00	3.000,00	5.000.000,00	1.295.000,00	3.000,00	30.293.000,00	29.995.556,56	297.443,44
	2012H032300	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	230.000,00	227.263,00	2.737,00
	1993H31850	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.499.916,83	83,17
	1993H031840	KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.090.000,00	1.089.616,95	383,05
	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	11.898.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.898.000,00	16.897.504,98	493,02
	2012H032310	MUHTELİF İŞLER	3.500.000,00	3.000,00	0,00	1.075.000,00	3.000,00	4.575.000,00	4.281.254,80	293.745,20
38		DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA²	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.138.850,97	0,00
	2009K120910	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	792.226,90	0,00
	2012K120800	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	346.624,07	0,00
40		EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.340,00	7.660,00
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.340,00	7.660,00
¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek ayrılmış gelir gerçekleşmediğinden tutara eklenmemiştir.										
² Bu sektördeki projelerin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.										

SEKTÖR-PROJE-BİRİM İTİBARIYLA GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör Kodu	Proje No	Eko. Sınıf		AÇIKLAMA	2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Program Od. Göre Gerçekleş	Yıl Sonu Od. Göre Gerçekleş
		1	2			Kurum İçi	Yedek	Likit						
				YATIRIMLAR TOPLAMI	45.508.000,00	3.000,00	5.000.000,00	3.987.108,00	3.000,00	54.495.108,00	47.516.254,03	6.807.704,94	104,41	87,19
10				SAĞLIK SEKTÖRÜ	20.000.000,00	0,00	0,00	2.692.108,00	0,00	22.692.108,00	16.189.506,50	6.502.601,50	80,95	71,34
	2012I000430			MUHTELİF İŞLER¹	20.000.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	21.160.000,00	14.657.398,50	6.502.601,50	73,29	69,27
		6	1	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	19.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150.000,00	13.162.496,05	5.987.503,95	68,73	68,73
		6	6	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	499.647,29	500.352,71	-	49,96
		6	1	Diş Hekimliği Fakültesi	850.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	1.010.000,00	995.255,16	14.744,84	117,09	98,54
	2012I000600			KESİN HESAP FARKI	0,00	0,00	0,00	1.532.108,00	0,00	1.532.108,00	1.532.108,00	0,00	-	100,00
		6	5	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	0,00	0,00	0,00	1.532.108,00	0,00	1.532.108,00	1.532.108,00	0,00	-	100,00
28				EĞİTİM SEKTÖRÜ	23.998.000,00	3.000,00	5.000.000,00	1.295.000,00	3.000,00	30.293.000,00	29.995.556,56	297.443,44	124,99	99,02
	2012H032300			ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	230.000,00	227.263,00	2.737,00	227,26	98,81
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	230.000,00	227.263,00	2.737,00	227,26	98,81
	1993H31850			FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.499.916,83	83,17	100,00	100,00
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.499.916,83	83,17	100,00	100,00
	1993H031840			KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.090.000,00	1.089.616,95	383,05	108,96	99,96
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.090.000,00	1.089.616,95	383,05	108,96	99,96
	2009H031640			DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	11.898.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.898.000,00	16.897.504,98	495,02	142,02	100,00
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	11.898.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.898.000,00	16.897.504,98	495,02	142,02	100,00
	2012H032310			MUHTELİF İŞLER	3.500.000,00	3.000,00	0,00	1.075.000,00	3.000,00	4.575.000,00	4.281.254,80	293.745,20	122,32	93,58
		6	1	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ²	1.700.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.000,00	1.927.000,00	1.768.098,55	158.901,45	104,01	91,75
		6	1	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	699.980,25	19,75	100,00	100,00
		6	3	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	52.269,88	730,12	104,54	98,62
		6	6	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.418,26	16.581,74	66,84	66,84
		6	7	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	1.845.000,00	1.727.487,86	117.512,14	172,75	93,63
38				DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA³	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.138.850,97	0,00	86,94	86,94
	2009K120910			MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	792.226,90	0,00	78,44	78,44
		6	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	792.226,90	0,00	78,44	78,44
	2012K120800			REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	346.624,07	0,00	115,54	115,54
		6	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	346.624,07	0,00	115,54	115,54
40				EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.340,00	7.660,00	96,17	96,17
	1997H050180			AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.340,00	7.660,00	96,17	96,17
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.340,00	7.660,00	96,17	96,17

¹ 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek ayrılmış gelir gerçekleşmediğinden tutara eklenmemiştir.

² 200.000 TL özgelirlerden karşılanmıştır.

³ Bu sektördeki projelerin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 1993H031850 – Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatı Projesi (Eğitim Sektörü)



2012 yılı Rektörlük Binası ve Fen Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatına ayrılan 7.500.000,00 TL olan ödeneğinin tamamı kullanılarak %95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2013 yılı başlarında hizmete açılması planlanmaktadır.



2.1.2 1993H031640 – Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Sektörü)

2012 yılı Derslikler ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Veteriner Fakültesi Binası ve Morfoloji Binası İnşaatı bulunmaktadır. 2012 yılı için program ödeneği olarak tahsis edilen 11.898.000,00 TL'nin 10.000.000,00 TL'si Morfoloji Binası için kalan 1.898.000,00 TL'si ise Veteriner Fakültesi Binası için öngörülmüştür. Ancak 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tamamlanması ve faaliyete geçebilmesi için Morfoloji Binasının tamamlanması şart olduğundan ödeneğin tamamı buraya kullanılmıştır. Bu ödenekler de yetersiz kalınca Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerekli görüşmeler yapılarak 4.000.000,00 TL ve 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 5.000.000,00 TL 2012 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7. maddesi çerçevesinde yedek ödenekten (Yatırımları Hızlandırma Ödeneği) karşılanmıştır. Morfoloji Binasının Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile birlikte 2013 yılı başında hizmete geçmesi planlanmaktadır.

2.1.3 1993H031840 – Kampüs Altyapısı (Eğitim Sektörü)



01.05.2012 tarihinde ihalesi yapılmış olan Kırıkkale Üniversitesi Altyapı İnşaatı işi kapsamında 25 metre genişliğinde 1250 metre uzunluğunda (31.250 metrekare) Yahşihan Yerleşkesi içine ring yolu yapılmıştır. Stabilize olarak yapılan yolun 2013 yılında kilit parke imalatı yapılması planlanmaktadır. 08.10.2012 tarihinde Kampüs Altyapısı 2. Kısım İş (İhale bedeli 147.000.TL) İhalesi kapsamında Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu etrafı kilit parke ve bordür imalatı yapılmıştır.



2.1.4 1997H050180 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Sektörü)

08.10.2012 tarihinde ihalesi yapılmış olup Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu spor binasının bakım onarımı ile halı sahasının sentetik çimleri, tel çitleri ve üstünün file ile kapatılması yapılmıştır. Eğitim Fakültesinin önündeki halı sahanın üstünün file ile kapatılıp halı sahaya tribün yapıldı. Eğitim Fakültesi içindeki jimnastik salonunun zemin kaplaması değiştirilmiştir.

2.1.5 2009K120910 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH Sektörü)

2012 yılında bu proje için 1.010.000.TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekle -2012 yılı programında yer alan proje yöneticisinin talepte bulunduğu laboratuvar cihazları alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının izni ile 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. Toplam gider gerçekleşmesi 792.226,90.TL olmuştur.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 2012H32310 – Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü)

2012 yılı için 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilen proje için 1.075.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Böylece toplam kaynak miktarı 4.575.000,00 TL seviyesine ulaşmıştır. Revize ödenek toplamı itibariyle bu kaynağın 1.800.000,00 TL'si çeşitli makine-teçhizat alımı, taşıt alımı vb. için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına; 700.000,00 TL'si basılı ve elektronik yayın alımları ve veri tabanı erişimleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına; 1.845.000,00 TL'si de çeşitli büyük onarım giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ayrılan 700.000,00 TL ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ayrılan 1.800.000,00 TL ile aşağıda ki tablolarda detayları sunulan iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir;

YAYIN ALIMI
612 ADET BASILI YAYIN ALIMI
500 ADET BASILI YAYIN ALIMI
2171 ADET BASILI YAYIN ALIMI
184 ADET BASILI YAYIN ALIMI
678 ADET BASILI YAYIN ALIMI
335 ADET SÜRELİ YAYIN ALIMI
LEXISNEXIS (VERİ TABANI)
WILEY INTERSCIENCE (VERİ TABANI)
AMA-AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (VERİ TABANI)
MATHSCINET (VERİ TABANI)
ASTM (STANDARTS COLLECTION, DIGITAL LIBRARY)(VERİ TABANI)
ONELOG X8 (VERİ TABANI)
SAGE (VERİ TABANI)
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (VERİ TABANI)
EBSCOHOST EBSCO DISCOVERY SERVICE ONLINE, ELECTRONIC JOURNAL SERVICE ONLINE (CLASSIFICATION WEB ONLINE, JOURNAL OF THE AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION)(VERİ TABANI)
EBSCO (DERMATOLOGY ONLINE, EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY ONLINE) (VERİ TABANI)
EBSCOHOST DENTISTRY ORAL SCIENCES SOURCE, EDUCATION RESEARCH COMPLETE ONLINE, LITERARY REFERENCE CENTER ONLINE (VERİ TABANI)
EBSCOHOST MEDLINE WITH FULL TEXT, SOCINDEX WITH FULLTEXT ONLINE, SPORTDISCUS WITH FULLTEXT ONLINE (VERİ TABANI)
GROVE MUSIC ONLINE (VERİ TABANI)
OXFORD JOURNAL ONLINE (VERİ TABANI)
BRIDGEMAN ART CULTURE HISTORY (VERİ TABANI)
ARGO (VERİ TABANI)
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (VERİ TABANI)
IOP (INSTITUTE OF PHYSICS) (VERİ TABANI)
PECYA (VERİ TABANI)
SPRINGER LINK (VERİ TABANI)
SWISSLEX (VERİ TABANI)
EBRARY ACADEMIC COMPLETE, ONLINE SHEET MUSIC (VERİ TABANI)
KAZANCI HUKUK OTOMASYON (VERİ TABANI)
UPTODATE (VERİ TABANI)
CLINICAL KEY (VERİ TABANI)
PRIMAL PICTURES ANATOMY PREMIER (ANATOMY TV)(VERİ TABANI)
JSTOR(VERİ TABANI)

REKTÖRLÜK(MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI)
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (20 ARAÇ İÇİN)
GÜZEL SANATLAR FAK. KAMERA SİSTEMİ BAĞLANTISI
3 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI (HUKUK MÜŞ.-KESKİN MYO.- SAĞLIK HİZ.MYO.)
FAKS VE YAZICI (GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ)
PERSONEL PLATFORMU
20 ADET YAZICI ALIMI
OPTİK OKUYUCU (YABANCI DİLLER BLM. BŞK.)
CUMHURİYET SALONUNA 500 ADET KONFERANS KOLTUĞU
2 ADET ÇİM BİÇME MAK., 2 ADET SIRT TIRPANI VE 1 ADET MOTORLU TESTERE
1 ADET TESFİYE KÜREĞİ
2 ADET FREKANS KONVEKTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
1 ADET JENERATÖR
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
AMFİ ÖĞRENCİ SIRALARI
OTOMATİK ÇİMENTO MİKSERİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER AMAÇLI KAN SAYIM CİHAZI
DOĞUM SETİ
VETERİNER DAHİLİYE MUAYENE SETİ
VETERİNER İNFÜZYON POMPASI
KÜÇÜK HAYVAN OPERASYON MASASI
BÜYÜK BAŞ HAYVAN NAKİL SEHPASI
KÜÇÜK HAYVAN MUAYENE MASASI
VETERİNER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
HAYVAN AMELİYATHANESİ YARDIMCI EKİPMANI
BİYOKİMYA ANALİZÖRÜ
VETERİNER AMAÇLI STANDART HASTABAŞI MONİTÖRÜ
LAMİNER KABİN
TEŞHİS LABORATUVAR SETİ
OPERASYON SETİ
AMFİ SES VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI 9 ADET
KÜÇÜK HAYVAN (KEDİ) KAFESİ (4 ADET)
VETERİNER AMAÇLI DİĞİTAL RÖNTGEN ÜNİTESİ
SUNİ TOHUMLAMA LABORATUVAR SETİ
GÜZEL SANATLAR FAK.
RESİM BÖLÜMÜ İÇİN, ŞÖVALE, TABURE VE ÇALIŞMA SEHPASI
3 KALEM 5 ADET MÜZİK ALETİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
SEMİNER ODASI İÇİN TEFRİŞ MALZEMESİ

KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
TOZ EMME MAKİNESİ
KOMPRÖSER
DERİ DİKİŞ MAKİNESİ
DÜZ DİKİŞ MAKİNASI
BAHŞILIDA AÇILACAK BİRİM İÇİN TEFRİŞ MALZEMELERİ(SINIFLAR İÇİN SIRA)
BAHŞILIDA AÇILACAK BİRİM İÇİN TEFRİŞ MALZEMELERİ(KOLTUK,MASA,YAZI TAHTASI)
KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU
1 ADET TELEFON SANTRALİ
1 ADET FOTOKOPİ
DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
RÖMORK
KAYNAK MAKİNASI
SIRT TIRPANI
SU BANYOSU
ANALİTİK TERAZİ
HUKUK FAKÜLTESİ
AMFİ VE SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ SIRASI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PORTATİF ELEKTROTERAPİ SETİ
FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SETİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR LABORATUVARI İÇİN KOLTUK
BAKIM ONARIM GİDERİ ÖDENEĞİ
BASIN-YAYINA AİT RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI TAMİRİ
CUMHURİYET SALONUNA AİT PROJEKSİYON CİHAZININ TAMİRİ
OTO GÜNEŞ ARAÇ TAMİRLERİ
ASLAN DİZEL ARAÇ TAMİRLERİ
SELENOĞLU ARAÇ TAMİRLERİ
METİN KARDEŞLER ARAÇ TAMİRLERİ
OR-AY OTOMOTİV
ASLAN DİZEL ARAÇ TAMİRLERİ
REKTÖRLÜK(BİLGİSAYAR ALIMI)
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 1 ADET BİLGİSAYAR
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİ. BŞK. 1 ADET BİLGİSAYAR
TIP FAKÜLTESİNİN İNTERNETE BAĞLANMASI (FİBER OPTİK KABLO)
VETERİNER FAK. AKTİF AĞ BİLEŞENLERİ VE ÜNİVERSİTE KABLOSUZ NETWORK PROJESİ
100 ADET BİLGİSAYAR VE MONİTÖR ALIMI
8 ADET LED ETKİLEŞİMLİ YAZI TAHTASI

REKTÖRLÜK(BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMI)
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ PROGRAMI(KEYS)
SİNERJİ YAZILIM (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)
ANTI VİRÜS PROGRAMI (BİLGİ İŞLEM)
PERSONEL OTOMASYON PROGRAMI (2011 YILI İÇİN)
S.G.K. UYUMU İÇİN PERS.DAİ.BŞK. HİTAP PROGRAMI
DAVA TAKİP PROGRAMI
YORDAM KÜTÜPHANE PROGRAMI
OFFİCE PROGRAMI LİSANS BEDELİ
REKTÖRLÜK TAŞIT ALIM
2 ADET BİNEK OTOMOBİL VE 1 ADET KAMYONET

2012 Yılı Yatırım Programı Muhtelif İşler Projesi kapsamında detay program ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaçlar kapsamında likit karşılığı 845.000,00 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 1.845.000,00 TL'ye ulaşmıştır. 2012 Yılı Program Kararnamesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ve 4734 Sayılı Kanun gereğince imalatların yapılabilmesi için ihaleleri yapılarak bitirilmiştir. Büyük Onarım işlerinde bahsedilen fakülte ve hizmet binalarımızın bakım onarım işleri için 6 adet ihale kapsamında mahal listesi, mimari proje, kroki, röleve, kesit ve detayları verilmiş olan imalatlar yapılmıştır.

- Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ve Rektörlüğe Bağlı Birimler Büyük Onarım İşleri

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Büyük Onarım işi kapsamında depolar ıslak hacimlere dönüştürmüştür. Bu kapsamda 60x60 menfez yapılması, mevcut döşemenin kırılarak yerine seramik yapılması, duvarların fayansla kaplanması, ıslak hacimlere dönüştürülen mahaller komple (tavan ve duvarlar) boyanmış, kırılan ve bozulan yerler eski haline geri getirilmiştir.

Adalet Meslek Yüksekokulunun (Hukuk Fakültesi binası içerisinde yer almaktadır) iki dersliğini ayıran duvar yıkılarak derslikler birleştirilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi otoparkına merdiven yapılmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Binası PTT giriş kısmına rampa yapılmıştır.

Merkez Kütüphanede; çevresindeki yolda meydana gelen kilit parke çökme ve bozulmalar kaldırılarak altı tesviye edilip sıkıştırılıp yeni kilit parke döşemesi yapılmıştır. Bodrum katta engelli tuvaletlerine geçiş için duvar kırılarak geçiş açılmıştır.

Mühendislik Fakültesi Binasında projeleri verilen blokların (yaya allesi, anfi ve sınıflar) koridorları, duvarları, tavanları boyanmış tesisatların bulunduğu kat ile klima santral

bloğu minha edildi. Giriş kısmın alüminyum doğraması sökülerek yerine fotoselli kapı monte edilmiştir.

- Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Binası ve Veteriner Fakültesi Binası Büyük Onarım İşi

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Merkezi Kafeterya-Yemekhanedeki zemin ve 1. kattaki bayan ve erkek tuvaletlerin mevcut seramikleri, yer ve duvarları sökülüp tesisat yapımından sonra yeniden yapılmıştır. Meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokulu ısı merkezi arasındaki galeri aydınlatması yapılmıştır. Meslek yüksekokulu ile B kapısı arasında aydınlatma yapılmıştır. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu kafeterya tuvaletlerinin elektrik tesisatı kullanılamaz durumda olduğundan yenilenmiştir. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu binası içi dahili telefon hatları kablo kanalı ile yeniden çekilerek dağıtımı yapılmıştır.

Veteriner Fakültesi Binası Onarım işi kapsamında mevcut hayvan barınağı önündeki rögar gideri için kazı ve kanal bağlantısı yapıp hizmet binası içi mekanları tamamen boyanmıştır.

- Eğitim Fakültesi Binası ve Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Büyük Onarım İşi

Eğitim Fakültesi hizmet binası girişe engelli giriş rampası yapımı için kırım yapıp, uygun eğimde metal saç ve profil demirler kullanılarak imalat yapılmıştır. Yapılan imalatın antipası, sentetik boyası vs. yapılarak tamamlanmıştır. Öğrencilerin kullandığı tuvaletlerdeki yer ve duvarlardaki mevcut seramik ve fayanslar sökülüp belirlenen krokiye göre yenisi yapılmıştır. Eski alüminyum pencere doğramaları sökülerek, yerine sert pvc plastik doğrama takılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi mevcut binası bitişiğine (kalorifer dairesi cephesi) kantin-kafeterya binası yapılmıştır.

- Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu ve Delice Meslek Yüksekokulu Binaları Büyük Onarım İşi

Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokuluna ek bina yapılmıştır. Mevcut bina ile yeni yapılan ek bina arasındaki bağlantı geçişleri koridorlardan sağlanmıştır. Güvenlik kulübesi çatısına su yalıtımı yapılmıştır. Delice Meslek Yüksekokulu'na tarım aletleri için garaj (sundurma) yapılmıştır.

- Cumhuriyet Salonu Büyük Onarım İşi

Cumhuriyet salonunun arkasına soyunma odaları ve teknisyenler odalarını içeren yeni bina yapılmıştır. Mevcut salonun tüm elektrik, makina, havalandırma, ısıtma, seslendirme sistemi yenilenmiştir.

- Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 2. Kısım - Veteriner Fakültesi Binası 2. Kısım ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Büyük Onarım İşi

Güzel Sanatlar Fakültesi bina çevresine 1 metre yüksekliğinde andezit kaplama yapıp, Eğitim Fakültesi ön (giriş cephesi) cephesi tamamen boyanmıştır.

2.2.2 2012H32300 – Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Eğitim Sektörü)

Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesinde yapılması düşünülen yaklaşık 20.000 m² kapalı alana sahip Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve eklentileri inşaat (5A sınıfı) projeleri ile İnşaat İhalelerine Esas Olacak Keşif, Metraj, Mahal Listeleri ve Teknik Şartnamelerinden Oluşan İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi ihalesi yapılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi Binası İnşaatına 2013 yılında başlanması planlanmaktadır.

2.2.3 2012K120800 – Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (DKH Sektörü)

2012 Yılı Yatırım Programı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 300.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir gerçekleşmesine göre 300.000.TL ödenek kaydı yapılmıştır. Proje kapsamında tahsis edilen ödenekten 346.624,07. TL harcanarak 2012 yılında 52 adet projenin ihtiyaçları karşılanmıştır.

2.2.4 2012I000600 – Kesin Hesap Farkı (Sağlık Sektörü)

2008I000710 numarası ile Üniversitemiz önceki yıllar yatırım programlarında yer alan “Hastane İnşaatı Projesi” planlandığı şekilde 2011 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Ancak sözleşme gereğince ve fiyat farkından dolayı yüklenici firmaya ödenmesi gereken 1.532.108,00 TL'nin ödenebilmesi için Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerekli görüşmeler yapılarak 2012 Yılı Yatırım Programına 2012I000600 – Kesin Hesap Farkı adıyla proje alınmıştır. Projenin finansmanı likit karşılığı ödenekten karşılanmıştır.

2.2.5 2012I000430 – Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)



2012 Yılı Yatırım Programı ile 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edilen Muhtelif İşler Projesinin 19.150.000,00 TL'si ile ilk etapta 2013 yılında faaliyete geçmesi planlanan 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine-teçhizat alımları ihtiyacının karşılanması ve 850.000,00 TL'si ile de Dış Hekimliği Fakültesinin makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Dış Hekimliği Fakültesi için ayrılan kaynak yetersiz kaldığından yıl içerisinde 160.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş ve 1.010.000,00 TL'ye ulaşan toplam ödeneğin 995.255,16 TL'si harcanmıştır.



Bunun yanında mevcut ve yeni alınan makine ve teçhizatların bakım-onarım sözleşmeleri kapsamında süresi gelen bakım-onarımlarının yapılabilmesi için likit karşılığı 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve proje ile ilişkilendirilmiştir. Bakım ve onarımlar kapsamında bu ödeneğin 499.647,29 TL'si harcanmıştır.



200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin makine-teçhizat ihtiyaçları için 19.150.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012/79952 ihale kayıt numarası ile 25.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinde Ameliyat Tavan Lambası, Ameliyat Masaları, Bilgisayarlı Tomografi ve MRI cihazları gibi bazı cihazlar Kamu İhale Kurulu Kararıyla ya iptal edilmiş ya da mahkeme süreçleri devam etmekte olduğundan bazı harcamalar henüz tamamlanamamıştır. Bu nedenle tahsis edilen ödeneğin 13.162.496,05 TL'lik kısmı kullanılabilmiştir.

